Id.	Pozycja Planu Płatności	Nr projektu	Nazwa zadania	Wykona %	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki
1	**1**		**ZTUO Szczecin**	**90%**	**1378 dn**	**2012-07-18**	**2016-12-09**	
2	2		Podpisanie kontraktu	100%	0 dn	2012-07-18	2012-07-18	
3	**3**		**Dokumentacja (z dokumentacją powykonawczą włącznie)**	**95%**	**1370 dn**	**2012-07-18**	**2016-11-30**	
4	**3.1**		**Projektowanie (do uzyskania pozwolenia na budowę)**	**100%**	**381 dn**	**2012-07-25**	**2013-10-11**	
5	**3.1.1**		**Dokumentacja do pozwolenia na budowę wraz z akceptacją Zamawiającego**	**100%**	**278 dn**	**2012-07-25**	**2013-06-13**	
20			Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę	100%	0 dn	2013-06-13	2013-06-13	11;18;5;1770;1
21	**3.1.2**		**Opracowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę (projekt budowlany + Raport OOŚ wraz z waloryzacją przyrodniczą) oraz uzyskanie decyzji**	**100%**	**73 dn**	**2013-07-19**	**2013-10-11**	
23	**3.1.3**		**Przeprowadzenie powtórnej oceny OOŚ**	**100%**	**35 dn**	**2013-09-02**	**2013-10-11**	
28	3.1.4		Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę	100%	0 dn	2013-10-14	2013-10-14	23ZR+1 dzień;2
29	3.1.5		Uzyskanie prawomocności decyzji pozwolenia na budowę	100%	0 dn	2013-10-29	2013-10-29	28ZR+11 dn
30	**3.1.5.A**		**Zamienne Pozwolenie na budowę**	**91%**	**729 dn**	**2014-01-20**	**2016-05-17**	
31	3.1.5.A.1		Opracowanie zamiennego projektu budowlanego wraz z obliczeniami sprawdzajacymi emisję hałasu	100%	69 dn	2014-01-20	2014-04-09	29ZR+58 dn
32	3.1.5.A.2		Uzgodnienie projektu zamiennego z IK i Zamawiaj	100%	21 cdn	2014-04-09	2014-04-30	31ZR-1 dzień
33	3.1.5.A.3		Uzgodnienie ZUDP	100%	21 cdn	2014-04-16	2014-05-07	32ZR-10 dn
34	3.1.5.A.4		Opracowanie wniosku o zamienne pozwolenie na	100%	1 dzień	2014-05-07	2014-05-07	31;32;33
35	3.1.5.A.5		Złożenie wniosku o zamienne pozwolenie na budo	100%	1 dzień	2014-06-03	2014-06-03	34ZR+18 dn;33
36	3.1.5.A.6		Procedowanie i uzgadnianie projektu budowlaneg	100%	55 cdn	2014-06-03	2014-07-28	35
37	3.1.5.A.7		Uzyskanie zamiennej decyzji pozwolenia na budo	100%	0 cdn	2014-07-28	2014-07-28	36
38	3.1.5.A.8		Uzyskanie prawomocnej decyzji	100%	14 cdn	2014-07-28	2014-08-11	37
39			Uzyskanie Zamiennej decyzji pozwolenia na budowę - Nr 2	0%	41 dn	2016-03-31	2016-05-17	
40	**3.1.5.B**		**Włączenie ZTUO do sieci elektrycznej, uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej**	**84%**	**1095 dn**	**2013-01-02**	**2016-06-30**	
41	3.1.5.B.1		Działania związane z włączeniem ZTUO do sieci elektrycznej, uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej	84%	1095 dn	2013-01-02	2016-06-30	13RR+67 dn
42	**3.1.5.C**		**Włączenie ZTUO do sieci cieplnej, uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii cieplnej**	**84%**	**1117 dn**	**2012-12-07**	**2016-06-30**	
43	3.1.5.C.1		Działania związane z włączeniem ZTUO do sieci cieplnej, uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii cieplnej	84%	1117 dn	2012-12-07	2016-06-30	14RR+49 dn
44	**3.1.5.D**		**Wyprowadzenie do Spółki Wodnej "Międzyodrze" (energia cieplna, podgrzana woda)**	**87%**	**1110 dn**	**2012-10-15**	**2016-04-29**	
45	3.1.5.D.1		Działania związane z wykonaniem wyprowadzenia do Spółki Wodnej "Międzyodrze" (energia cieplna, podgrzana woda)	87%	947 dn	2012-10-15	2016-04-29	13RR+10 dn;14RR+10 dn
46	**3.1.6**		**Pobranie dziennika budowy oraz zgłoszenie rozpoczęcia prac budowlanych**	**100%**	**1 dzień**	**2013-10-25**	**2013-10-25**	**28**
47	**3.1.7**		**Przekazanie wielobranżowych projektów wykonawczych**	**96%**	**899 dn**	**2013-05-07**	**2016-03-18**	
1766			Zakończenie przekazania wielobranżowych projektów wykonawczych	0%	0 dn	2016-03-18	2016-03-18	47
1767	3.1.8		Dokumentacja powykonawcza	0%	157 dn	2016-06-01	2016-11-30	19ZR+38 dn
1768	**3.2**		**Zapewnienie Jakości i bezpieczeństwo**	**100%**	**924 dn**	**2012-07-18**	**2015-06-30**	
1773	**3.3**		**Dokumentacja na etapie wykonawstwa**	**100%**	**964 dn**	**2013-05-06**	**2016-06-01**	
1774	3.3.1		Projekt zagospodarowania placu budowy	100%	46 dn	2013-05-06	2013-07-08	
1775	3.3.2		Etapowanie i opis technologii poszczególnych rod	100%	402 dn	2013-12-16	2015-06-30	1785
1776	3.3.3		Program Prób Końcowych (PPK)	100%	23 dn	2016-05-02	2016-06-01	2705RZ-61 cdn
1777	**3.4**		**Dokumentacja dot. Obsługi, konserwacji i szkoleń**	**41%**	**367 dn**	**2015-06-01**	**2016-07-30**	
1778	3.4.1		Dokumentacja dot. Obsługi, konserwacji i szkoleń	41%	341 dn	2015-06-01	2016-07-30	
1779	3.4.2		Instrukcje obsługi i konserwacji	41%	341 dn	2015-06-01	2016-07-30	1778RR
1780	3.4.3		Instrukcje technologiczne	41%	341 dn	2015-06-01	2016-07-30	1779RR
1781	3.4.4		Dokumentacja techniczno-ruchowa wszystkich urządzeń	41%	341 dn	2015-06-01	2016-07-30	1780RR
1782	3.4.5		Plan szkolenia Personelu	0%	17 dn	2016-04-18	2016-05-06	
1783	3.4.6		Lista części zamiennych, eksploatacyjnych i szybkozużywających się	41%	341 dn	2015-06-01	2016-07-30	1781RR
1784			Przejęcie placu budowy	100%	0 dn	2013-12-11	2013-12-11	
1785			Rozpoczęcie robót budowlanych	100%	0 dn	2013-12-16	2013-12-16	46;283;1784;29
1786			Przejęcie placu budowy - roboty przygotowawcze	100%	0 dn	2013-05-08	2013-05-08	1785;1784;177
1787	**4**		**Zaplecze wykonawcy**	**75%**	**968 dn**	**2013-10-30**	**2016-11-30**	
1788	**4.1**		**Organizacja placu budowy i podłączenie mediów**	**100%**	**49 dn**	**2013-10-30**	**2013-12-25**	
1803	4.2		Utrzymanie placu budowy	69%	808 dn	2013-10-30	2016-11-30	1786;29
1804	4.3		Likwidacja zaplecza budowy	0%	12 dn	2016-11-17	2016-11-30	1803ZR-14 dn
1805	**5**		**Segment przyjmowania i magazynowania odpadów: A.1, A.2, A.3, A.9, A.10, A.15, A.16, K.1, K.2**	**60%**	**802 dn**	**2014-01-08**	**2016-07-29**	
1806	**5.1**		**Roboty budowlane**	**57%**	**802 dn**	**2014-01-08**	**2016-07-29**	**1785**
1807	**5.1.1**		**Fundamenty**	**100%**	**587 dn**	**2014-01-08**	**2015-11-23**	**1785**
1808	**5.1.1.1**		**Budowa portierni**	**100%**	**56 dn**	**2015-03-11**	**2015-05-14**	
1810	**5.1.1.2**		**Budowa stanowiska ważenia**	**100%**	**30 dn**	**2015-10-20**	**2015-11-23**	
1812	**5.1.1.3**		**Budowa hali przyjęcia odpadów wraz z bunkrem**	**100%**	**543 dn**	**2014-01-08**	**2015-10-02**	
1853	**5.1.1.4**		**Budynek wielofunkcyjny - część socjalno-administracyjno-edukacyjna i pomieszczenia A.9**	**100%**	**233 dn**	**2014-11-07**	**2015-08-05**	
1860	**5.1.2**		**Konstrukcja budynku**	**38%**	**540 dn**	**2014-11-10**	**2016-07-29**	
1861	**5.1.2.1**		**Budowa portierni z wykończeniem**	**25%**	**239 dn**	**2015-09-04**	**2016-06-07**	**1808**
1862	5.1.2.1.1		Posadzka	0%	24 dn	2016-05-11	2016-06-07	927
1863	5.1.2.1.2		Ściany zewnętrzne	100%	56 dn	2015-09-04	2015-11-20	1809
1864	5.1.2.1.3		Stolarka okienna i drzwiowa zewn	0%	41 dn	2016-03-14	2016-04-29	1863ZR+81 dn
1865	5.1.2.1.4		Elewacja	0%	32 dn	2016-05-02	2016-06-07	1864

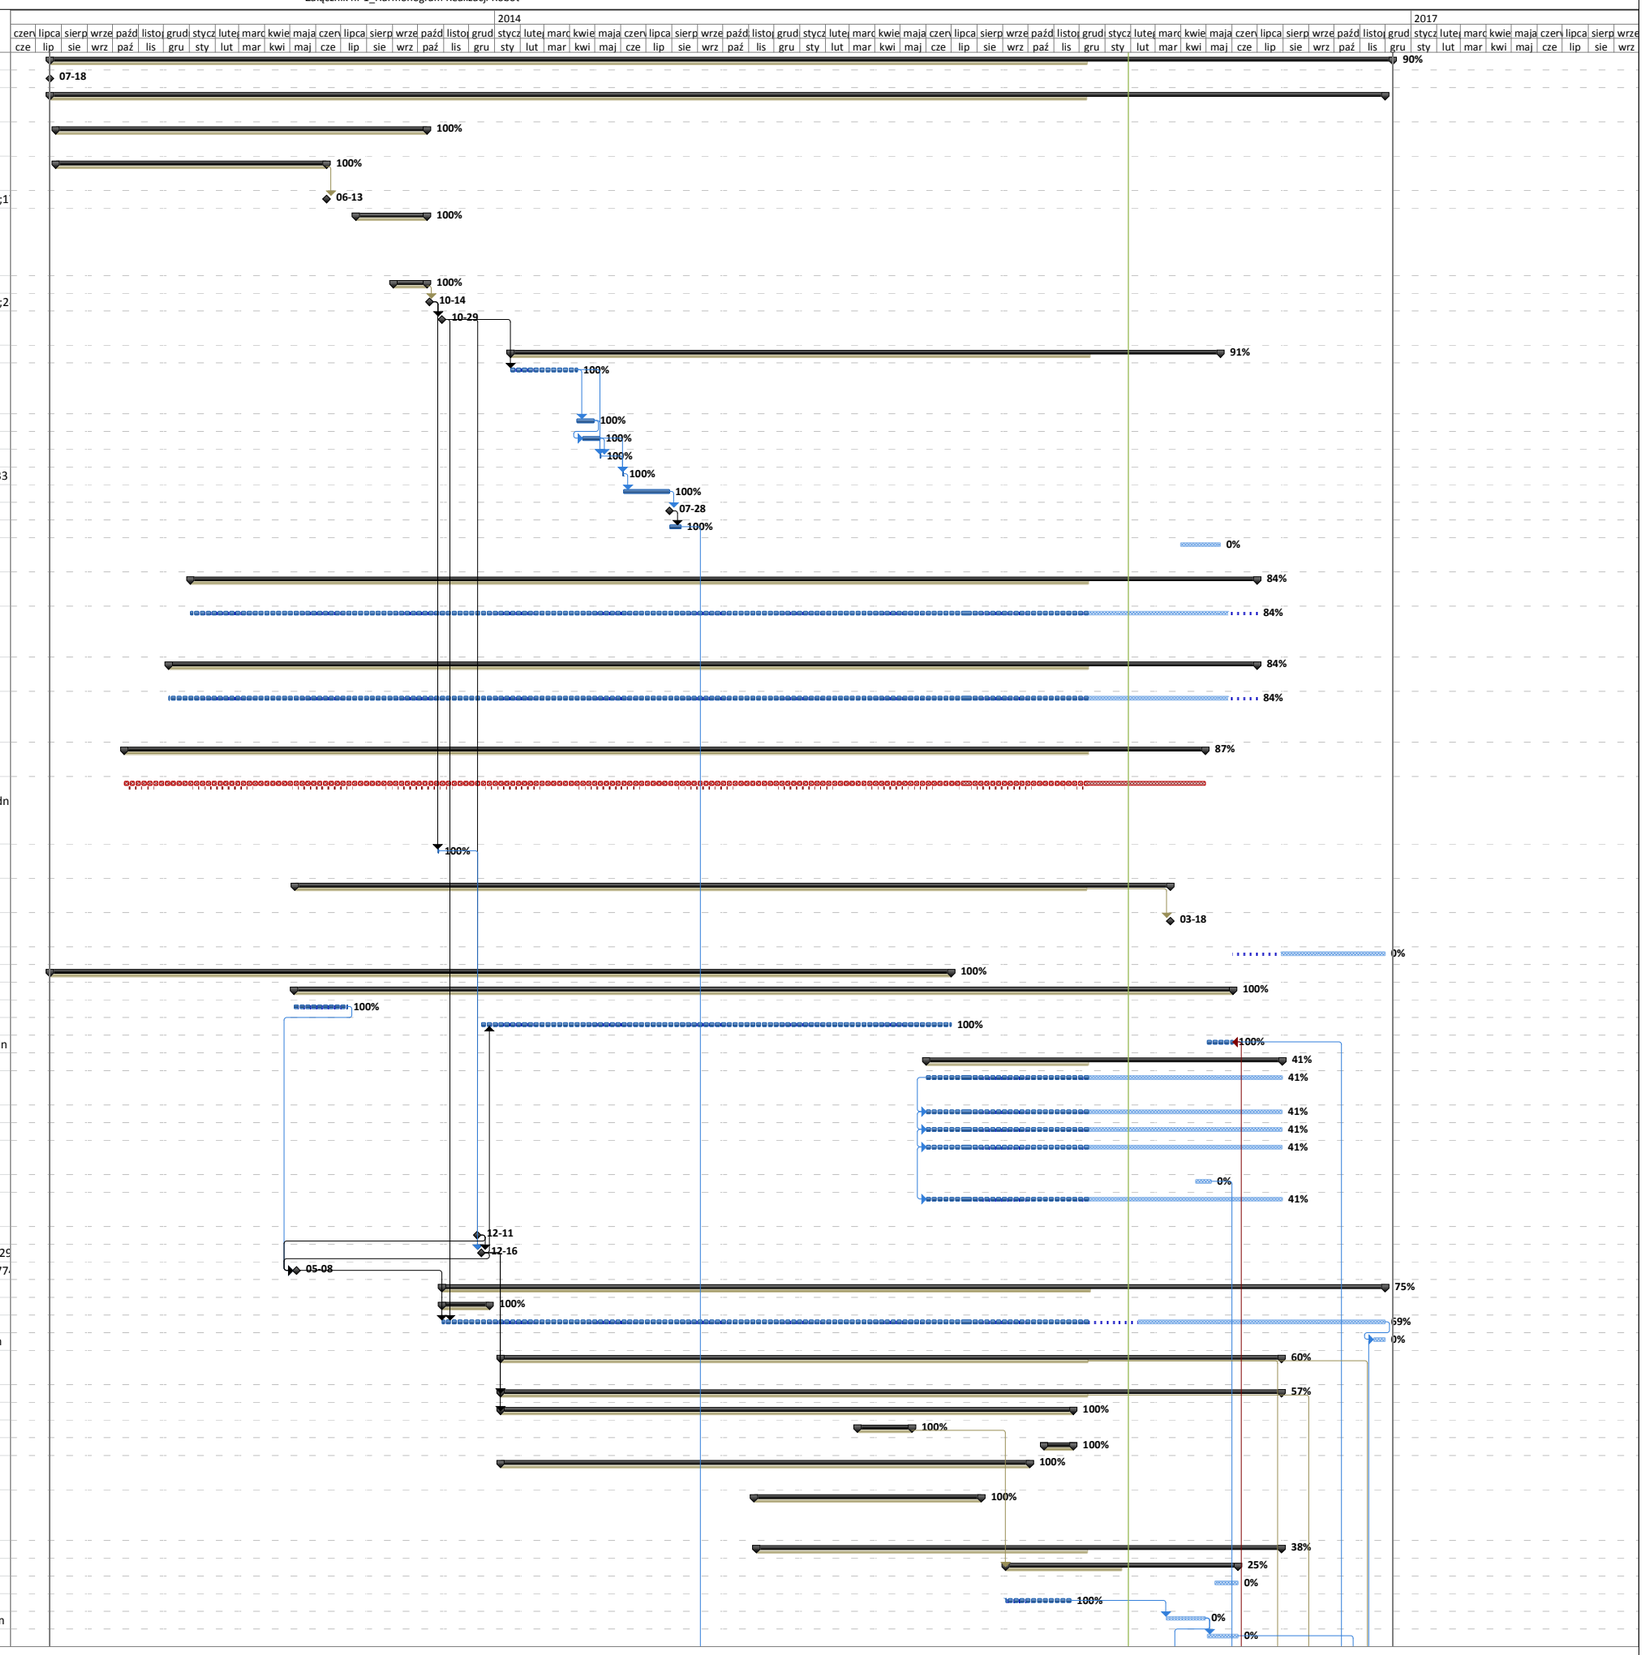

Id.	Pozycja Planu Płatności	Nr projektu	Nazwa zadania	Wykona %	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki
1866	5.1.2.1.5		Ściany wewnętrzne	0%	23 dn	2016-04-04	2016-04-29	1864ZR-25 dn
1867	5.1.2.1.6		Tynki wewnętrzne	0%	9 dn	2016-04-30	2016-05-10	1866;50RR
1868	5.1.2.1.7		Wykończenie	0%	42 dn	2016-04-20	2016-06-07	1867ZR-18 dn
1869	**5.1.2.3**		**Budowa hali przyjęcia odpadów, pomieszczenia: A.10, A.15 i A.16, budynek administracyjny A.1 (pomiędzy osią "2" i "17" oraz osiami "B" i "C")**	**9%**	**258 dn**	**2015-10-05**	**2016-07-29**	
1870	**5.1.2.3.1**		**Zbrojenie słupów i ścian (pomiędzy osiami "2" i "17"/ "A" i "C")**	**30%**	**161 dn**	**2015-10-05**	**2016-04-07**	**1849**
1871	5.1.2.3.1.1		Ściany, słupy poziom od +0,00 do +12,89 pomiędzy osiami "A" i "C"	100%	11 dn	2015-10-05	2015-10-19	1849
1872	5.1.2.3.1.2		Ściany, słupy poziom od +12,89 do +16,89 pomiędzy osiami "B" i "C"	0%	13 dn	2016-01-25	2016-02-08	1875;1879
1873	5.1.2.3.1.3		Ściany, słupy poziom od +16,89 do +21,00 pomiędzy osiami "B" i "C"	0%	13 dn	2016-03-24	2016-04-07	1872ZR+13 dn;1880ZR+1
1874	**5.1.2.3.2**		**Betonowanie słupów i ścian (pomiędzy osiami "2" i "17"/ "A" i "C")**	**51%**	**153 dn**	**2015-10-20**	**2016-04-13**	
1875	5.1.2.3.2.1		Ściany, słupy poziom od +0,00 do +12,89 pomiędzy osiami "A" i "C"	100%	30 dn	2015-10-20	2015-11-30	1871
1876	5.1.2.3.2.2		Ściany, słupy poziom od +12,89 do +16,89 pomiędzy osiami "B" i "C"	0%	18 dn	2016-02-02	2016-02-22	1872ZR-6 dn
1877	5.1.2.3.2.3		Ściany, słupy poziom od +16,89 do +21,00 pomiędzy osiami "B" i "C"	0%	11 dn	2016-04-01	2016-04-13	1873ZR-6 dn
1878	**5.1.2.3.3**		**Strop nad halą od poziomu pomiędzy osiami "2" i "17"/ "A" i "C")**	**0%**	**122 dn**	**2015-12-15**	**2016-05-03**	
1879	5.1.2.3.3.1		Strop poziom +12,89 pomiędzy osiami "A" i "C"	0%	35 dn	2015-12-15	2016-01-22	1875ZR+10 dn
1880	5.1.2.3.3.2		Strop poziom +16,89 pomiędzy osiami "B" i "C"	0%	24 dn	2016-02-24	2016-03-22	1876ZR+1 dzień
1881	5.1.2.3.3.3		Strop poziom +21,00 pomiędzy osiami "B" i "C"	0%	16 dn	2016-04-15	2016-05-03	1877ZR+1 dzień
1882	5.1.2.3.4		Pokrycie dachowe	0%	17 dn	2016-05-06	2016-05-25	1878ZR+2 dn
1883	5.1.2.3.5		Stolarka okienna i drzwiowa	0%	60 dn	2016-05-04	2016-07-12	1878
1884	5.1.2.3.6		Elewacja	0%	60 dn	2016-05-04	2016-07-12	1883RR
1885			Prace murarskie zewnętrzne	0%	60 dn	2016-02-15	2016-04-23	
1886	5.1.2.3.7		Wykończenie	0%	75 dn	2016-05-04	2016-07-29	1883RR;1868ZZ
1887	**5.1.2.4**		**Dwukomorowy bunkier odpadów**	**67%**	**540 dn**	**2014-11-10**	**2016-07-29**	
1888	**5.1.2.4.1**		**Konstrukcja żelbetowa powyżej poziomu "0" (od poziomu "0" do poziomu "+14,00") - ściana kotłowni**	**100%**	**291,1 dn**	**2014-11-10**	**2015-10-15**	**366;1842**
1895	**5.1.2.4.2**		**Konstrukcja żelbetowa powyżej poziomu "14" - ściana kotłowni do poziomu +30,30**	**38%**	**140,9 dn**	**2015-10-01**	**2016-03-11**	**1888ZR-21 dn;1892ZR-21**
1896	5.1.2.4.2.1		Ściana bunkra od strony hali kotłów do poziomu od 14,00 do +18,70	100%	42 dn	2015-10-01	2015-11-30	1894ZR-10 dn
1897	5.1.2.4.2.2		Ściana bunkra od strony hali kotłów do poziomu od 18,70 do +22,00	64%	24,9 dn	2015-11-20	2015-12-21	1896ZR-6 dn
1898	5.1.2.4.2.3		Ściana bunkra od strony hali kotłów do poziomu od 22,00 do +30,30	0%	86 dn	2015-12-04	2016-03-11	1897ZR-20 dn
1899			Pozostała konstrukcja żelbetowa bunkra na	74%	355 dn	2014-12-10	2016-03-25	1890ZR+3 dn
1900	5.1.2.4.3		Konstrukcje stalowe dachu	0%	42 dn	2016-04-13	2016-05-31	360;1895;1947
1901	5.1.2.4.4		Pokrycie dachowe	0%	25 dn	2016-06-01	2016-06-29	1900;363
1902	5.1.2.4.5		Wykończenie	0%	26 dn	2016-06-30	2016-07-29	1899;1901
1903	**5.1.2.5**		**Budynek wielofunkcyjny - część socjalno-administracyjno-edukacyjna (pomiędzy osiami "1" i "2" i "B" i "C")**	**25%**	**262 dn**	**2015-09-01**	**2016-06-30**	
1904	5.1.2.5.1		Klatka schodowa SCH-1 (pomiędzy osiami "1	45%	163 dn	2015-09-01	2016-03-23	301;1854;304;1
1905	5.1.2.5.2		Posadzka, posadzki wykończenie	0%	85 dn	2016-03-24	2016-06-30	301;1854;304;1
1906	**5.1.2.5.4**		**Stropy pośrednie**	**67%**	**57 dn**	**2015-10-28**	**2015-12-31**	
1907	5.1.2.5.4.1		Stropy pośrednie - 1 (poziom +3,655)	100%	7 dn	2015-10-28	2015-11-05	304;301;1904R
1908	5.1.2.5.4.2		Stropy pośrednie - 2 (poziom +6,225)	100%	17 dn	2015-11-12	2015-12-04	304;1907;1911
1909	5.1.2.5.4.3		Stropy pośrednie - 3 (poziom +9,890)	0%	12 dn	2015-12-19	2015-12-31	304;1912
1910	**5.1.2.5.5**		**Schody**	**29%**	**109 dn**	**2015-11-05**	**2016-03-09**	
1911	5.1.2.5.5.1		Schody - 1 (od poziomu +0,90 do +6,225)	100%	22 dn	2015-11-05	2015-12-04	1904RR;1907ZF
1912	5.1.2.5.5.2		Schody - 2 (od poziomu +6,225 do +12,89)	45%	11 dn	2015-12-07	2015-12-18	1911;1908ZR-1
1913	5.1.2.5.5.3		Schody - 3 (od poziomu +12,89 do +16,89)	0%	59 dn	2016-01-01	2016-03-09	1909
1914	5.1.2.5.6		Stropodach (poziom +21,00)	0%	16 dn	2016-04-22	2016-05-10	1913;1881RR+5
1915	5.1.2.5.7		Pokrycie dachowe	0%	25 dn	2016-05-04	2016-06-01	1914ZR-6 dn
1916	5.1.2.5.8		Elewacja	0%	42 dn	2016-05-04	2016-06-21	1915RR
1917	5.1.2.5.9		Stolarka drzwiowa i okienna	0%	42 dn	2016-05-04	2016-06-21	1907;1909;1916
1918	5.1.2.5.12		Ściany windy przy ścianie SC-2 bunkra odpadów (pomiędzy osiami "W1" - "W2"/	27%	122 dn	2015-10-28	2016-03-23	301;1854;304;1
1919	**5.1.2.6**		**Pomieszczenie A.9, część administracyjna oś 1-2, oś C-G**	**38%**	**309 dn**	**2015-08-06**	**2016-07-29**	
1920	5.1.2.6.1		Posadzka - wylewka	0%	16 dn	2016-04-04	2016-04-21	1859;307
1921	5.1.2.6.2		Ściany zewnętrzne	100%	69 dn	2015-08-26	2015-11-30	1923RR+14 dn
1922	5.1.2.6.3		Ściany wewnętrzne	20%	46 dn	2015-12-01	2016-01-22	1923ZR+5 dn;19
1923	5.1.2.6.4		Stropy (poziom +6,225, +10,00 oraz +14,40)	100%	56 dn	2015-08-06	2015-10-22	1859
1924	5.1.2.6.5		Tynki wewnętrzne	0%	42 dn	2015-12-29	2016-02-15	1922RR+21 dn
1925	5.1.2.6.6		Stolarka okienna i drzwiowa zewn	0%	23 dn	2016-03-14	2016-04-08	1921;1923
1926	5.1.2.6.7		Elewacja	0%	35 dn	2016-06-06	2016-07-15	1925RR+60 dn
1927	5.1.2.6.8		Wykończenie	0%	70 dn	2016-05-10	2016-07-29	1922;1925ZR+2
1928	**5.1.3**		**Instalacje i wyposażenie**	**1%**	**204 dn**	**2015-12-07**	**2016-07-29**	
1929	5.1.3.1		Instalacje wentylacji i ogrzewania	0%	103 dn	2016-04-01	2016-07-29	319;322;328;33
1930	5.1.3.2		Instalacje wod-kan	3%	179 dn	2015-12-07	2016-06-30	
1931	5.1.3.3		Instalacje tryskaczowe	0%	103 dn	2016-04-01	2016-07-29	1929RR
1932	**5.2**		**Zamówienie, dostawa wraz z akceptacją dokumentacji przez Zamawiającego**	**83%**	**644 dn**	**2014-06-12**	**2016-06-30**	
1933	5.2.1		System wag	100%	288 dn	2014-10-24	2015-11-30	
1934	5.2.2		System detekcji odpadów radioaktywnych	100%	267 dn	2014-10-24	2015-10-30	
1935	5.2.3		System rozdrabniania odpadów	62%	355 dn	2015-03-31	2016-05-16	
1936	5.2.4		Termowizyjny system gaszenia pianą	0%	130 dn	2016-02-01	2016-06-30	
1937	5.2.5		Suwnica	100%	253 dn	2014-12-12	2015-11-30	

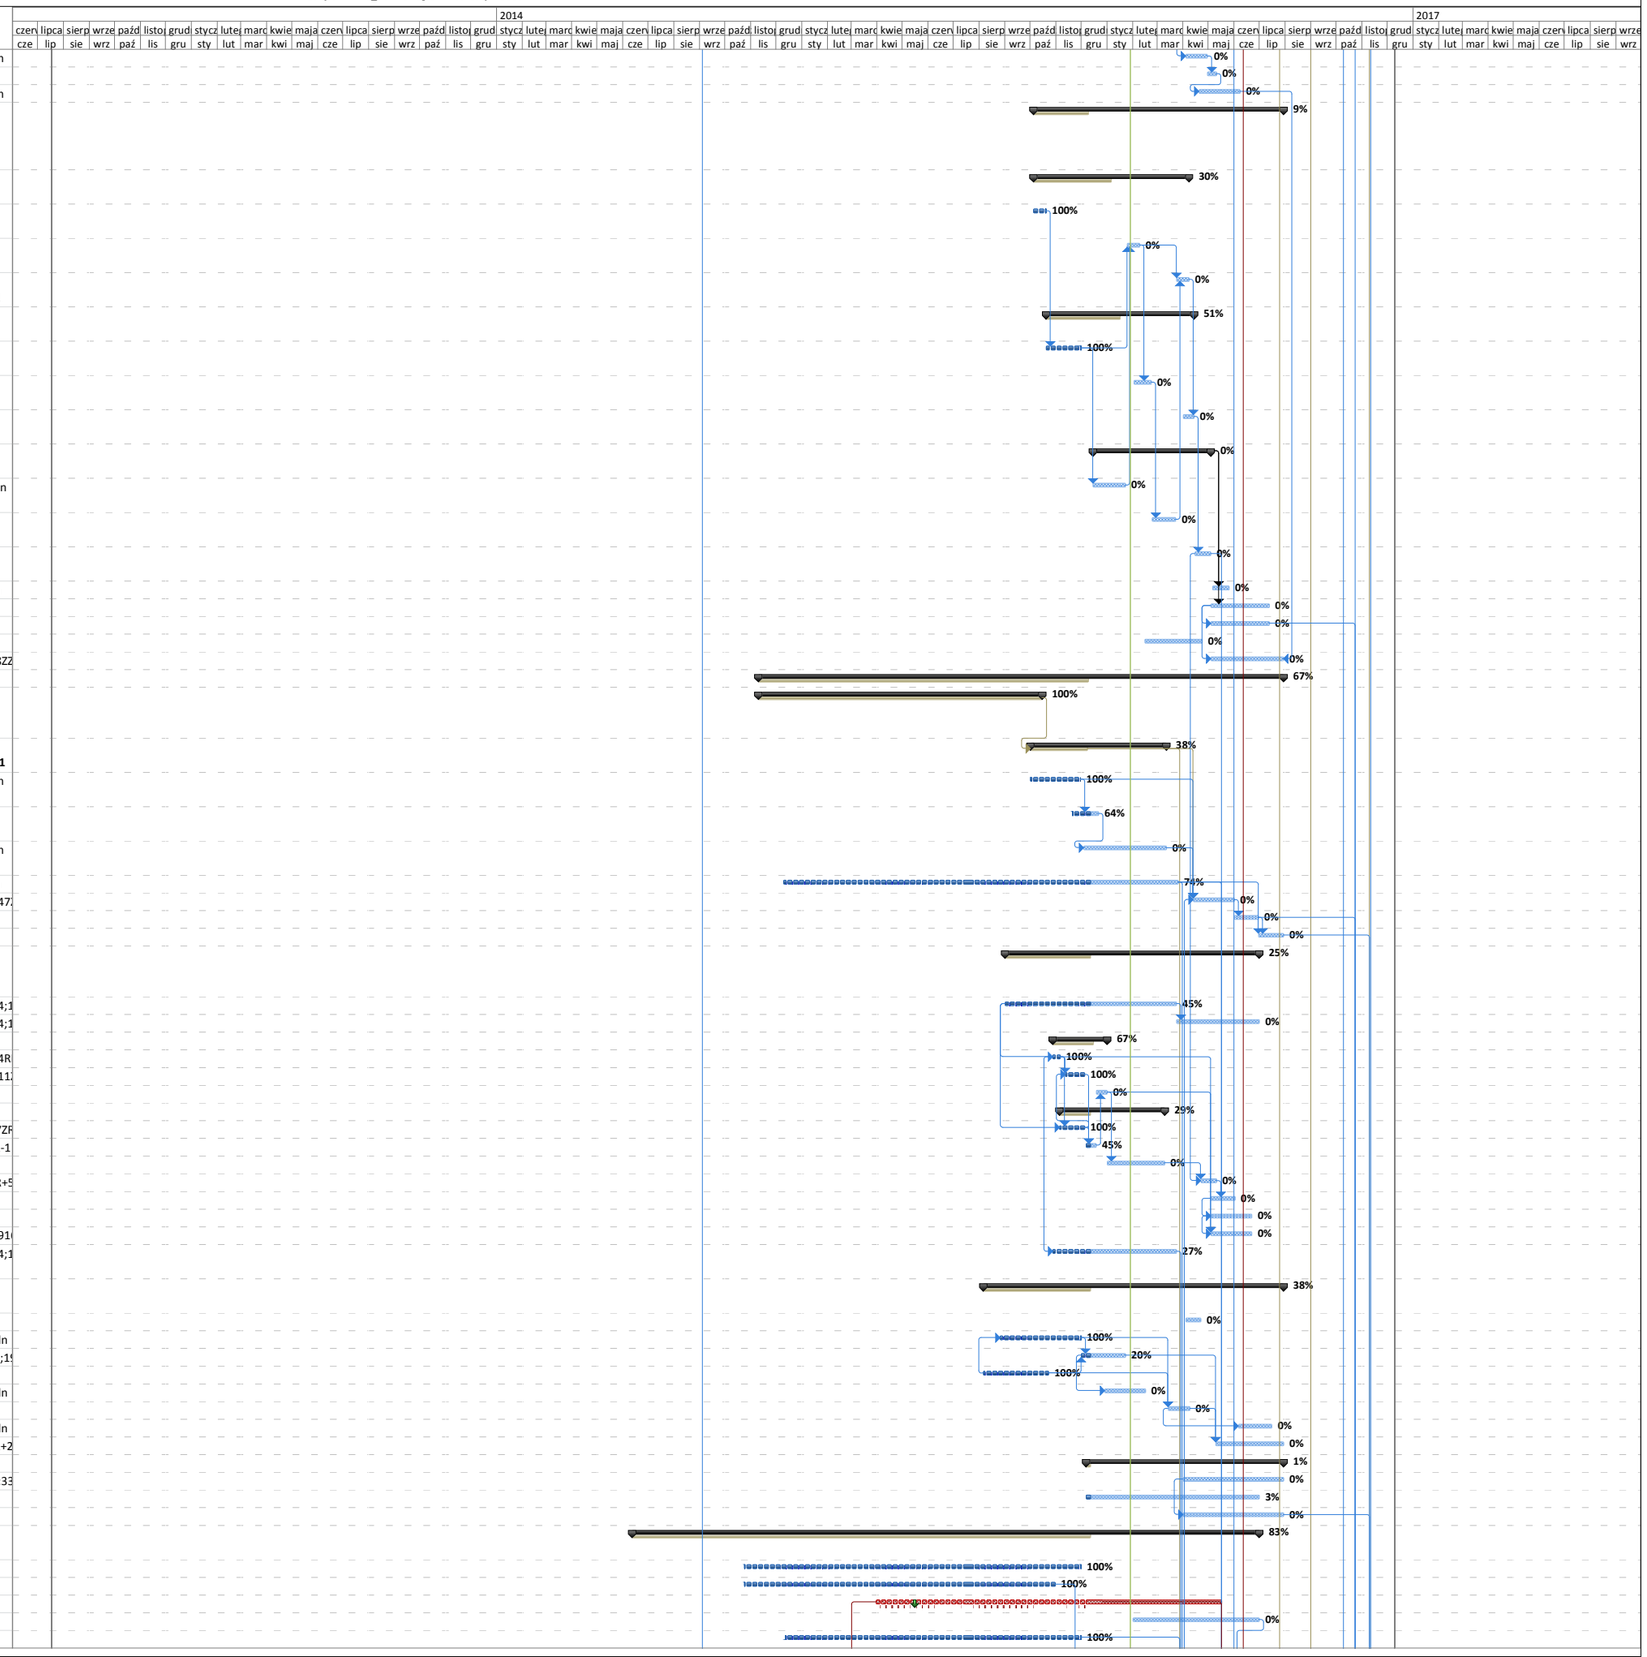

Id.	Pozycja Planu Płatności	Nr projektu	Nazwa zadania	Wykona %	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki
1938	5.2.6		System belowania i foliowania	100%	160 dn	2015-03-12	2015-10-30	1935RR
1939	5.2.7		Myjnia kół pojazdów opuszczających ZTUO	100%	202 dn	2014-10-24	2015-07-31	
1940	5.2.8		Windy osobowe	100%	363 dn	2014-06-12	2015-10-30	
1941	5.2.9		Klapy załadowcze w bunkrze odpadów	55%	298 dn	2015-04-30	2016-05-16	
1942	**5.3**		**Montaż**	**6%**	**216 dn**	**2015-11-23**	**2016-07-29**	
1943	5.3.1		System wag	10%	135 dn	2015-11-24	2016-04-29	1811;1033
1944	5.3.2		System detekcji odpadów radioaktywnych	10%	135 dn	2015-11-24	2016-04-29	1934;1943RR
1945	5.3.3		System rozdrabniania odpadów	0%	39 dn	2016-05-17	2016-06-30	1935;2168;215
1946	5.3.4		Termowizyjny system gaszenia pianą	0%	39 dn	2016-06-15	2016-07-29	1936ZR-14 dn
1947	5.3.5		Suwnica	0%	56 dn	2016-03-28	2016-05-31	1937;1895;189
1948	5.3.6		System belowania i foliowania	0%	25 dn	2016-07-01	2016-07-29	1938;1945
1949	5.3.7		Myjnia kół pojazdów opuszczających ZTUO	8%	189 dn	2015-11-23	2016-06-30	2564
1950	5.3.8		Windy osobowe	0%	54 dn	2016-03-24	2016-05-25	1940;1918;217
1951	5.3.9		Klapy załadowcze w bunkrze odpadów	0%	39 dn	2016-05-17	2016-06-30	1881;1899;194
1952			Zakończenie segmentu przyjmowania i magazynowania odpadów	0%	0 dn	2016-07-29	2016-07-29	1942;1945;194
1953	**6**		**Segment spalania odpadów: A.5, A.6**	**88%**	**1043 dn**	**2013-04-02**	**2016-07-29**	
1954	**6.1**		**Budowlane**	**76%**	**802 dn**	**2014-01-08**	**2016-07-29**	
1955	**6.1.1**		**Fundamenty**	**100%**	**271 dn**	**2014-01-08**	**2014-11-19**	
2000	**6.1.2**		**Konstrukcja budynku**	**83%**	**573 dn**	**2014-09-04**	**2016-07-01**	**447;38**
2001	**6.1.2.1**		**Konstrukcja żelbetowa**	**100%**	**313 dn**	**2014-09-04**	**2015-09-03**	
2009	**6.1.2.2**		**Konstrukcja stalowa**	**95%**	**212 dn**	**2015-05-15**	**2016-01-15**	
2010	6.1.2.2.1		konstrukcja stalowa hali oś "I" - "H" pomiędzy osiami "3"-"16"	100%	107 dn	2015-05-15	2015-10-09	2007RR
2011	6.1.2.2.2		konstrukcja stalowa hali oś "K" - "J" pomiędzy osiami "3"-"16"	100%	107 dn	2015-05-15	2015-10-09	2007;2010RR
2012	6.1.2.2.3		konstrukcja stalowa hali oś "M"- "L" pomiędzy osiami "3"-"16"	100%	107 dn	2015-05-15	2015-10-09	2007;2010RR
2013	6.1.2.2.4		konstrukcja stalowa hali oś "N'" do "N" pomi	100%	107 dn	2015-05-15	2015-10-09	2007;2010RR
2014	6.1.2.2.5		konstrukcja dachu	82%	168 dn	2015-05-15	2016-01-15	2013RR+30 dn
2015	**6.1.2.3**		**Elewacje**	**42%**	**87 dn**	**2015-10-22**	**2016-01-29**	
2016	6.1.2.3.1		Elewacja oś 16	37%	68 dn	2015-11-09	2016-01-29	416;2011ZR+9
2017	6.1.2.3.2		Elewacja oś 3	46%	80 dn	2015-10-22	2016-01-29	416;2012
2018	6.1.2.4		Pokrycie dachowe	48%	91 dn	2015-10-13	2016-02-15	2014ZR-58 dn
2019	6.1.2.5		Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	0%	17 dn	2016-05-02	2016-05-20	2016;2017
2020	6.1.2.6		Wykończenie	0%	35 dn	2016-05-23	2016-07-01	2019
2021	**6.1.3**		**Instalacje**	**54%**	**618 dn**	**2014-08-11**	**2016-07-29**	
2022	6.1.3.1		Instalacje wentylacji i ogrzewania	0%	105 dn	2016-03-01	2016-06-30	422;425
2023	6.1.3.2		Instalacje wod-kan	64%	550 dn	2014-08-11	2016-07-29	
2024	**6.2**		**Zamówienie, dostawa wraz z akceptacją dokumentacji przez Zamawiającego**	**98%**	**911 dn**	**2013-04-02**	**2016-02-26**	
2025	6.2.1		Konstrukcja nośna kotła i paleniska linii 1	100%	121 dn	2014-05-15	2014-11-27	1150
2026	6.2.2		Konstrukcja nośna kotła i paleniska linii 2	100%	242 dn	2014-05-15	2015-05-15	1150
2027			Inspekcja części ciśnieniowej membran kotła	100%	0 dn	2014-08-28	2014-08-28	2042
2028	**6.2.3**		**Palenisko rusztowe linii 1 wraz ze stacją hydrauliczną**	**100%**	**67 dn**	**2014-08-14**	**2014-10-30**	
2031	**6.2.4**		**Palenisko rusztowe linii 2 wraz ze stacją hydrauliczną**	**100%**	**67 dn**	**2014-08-14**	**2014-10-30**	
2034	6.2.5		Odżużlacz linii 1	100%	2 dn	2014-08-14	2014-08-15	1154;2030RR
2035	6.2.6		Odżużlacz linii 2	100%	2 dn	2014-08-14	2014-08-15	1154;2033RR
2036	**6.2.7**		**Walczakowy kocioł parowy linii 1**	**100%**	**431 dn**	**2014-06-02**	**2015-10-16**	
2052	**6.2.8**		**Walczakowy kocioł parowy linii 2**	**100%**	**413 dn**	**2014-06-23**	**2015-10-16**	
2068			Inspekcja walczaków	100%	1 dzień	2014-08-26	2014-08-26	2046ZR-15 dn
2069	6.2.9		System powietrza pierwotnego i wtórnego linii 1	100%	15 dn	2015-02-23	2015-03-13	1354ZR-45 dn;1
2070	6.2.10		System powietrza pierwotnego i wtórnego linii 2	100%	15 dn	2015-02-23	2015-03-13	1354ZR-45 dn;1
2071	6.2.11		Zespół palników olejowych rozruchowo-wspomag	100%	40 dn	2015-04-16	2015-06-10	1233ZR-7 dn
2072	6.2.12		Zespół palników olejowych rozruchowo-wspomag	100%	40 dn	2015-04-16	2015-06-10	1233ZR-7 dn
2073	6.2.13		Zespół podgrzewacza powietrza pierwotnego linii	100%	3 dn	2014-11-11	2014-11-13	1354ZR-100 dn
2074	6.2.14		Zespół podgrzewacza powietrza pierwotnego linii	100%	4 dn	2014-11-11	2014-11-14	1354ZR-100 dn
2075	6.2.15		Przegrzewacz pary linii 1	100%	44 dn	2014-06-18	2014-08-18	1200ZR+12 dn
2076	6.2.16		Przegrzewacz pary linii 2	100%	132 dn	2014-06-18	2014-12-18	1200ZR+12 dn
2077	6.2.17		Układ wody zasilającej	100%	83 dn	2015-04-07	2015-07-29	1182ZR+70 dn
2078			Inspekcja ZWZ	100%	0 dn	2014-12-22	2014-12-22	
2079			Zamówienie segmentu spalania odpadów i odzysk	100%	0 dn	2013-04-02	2013-04-02	
2080	6.2.18		Dostawa suwnicy nad bunkrem żużla	80%	329 dn	2014-12-12	2016-02-26	
2081	**6.3**		**Montaż**	**86%**	**559 dn**	**2014-09-19**	**2016-06-30**	
2082	**6.3.1**		**Konstrukcja nośna kotła i paleniska linii 1**	**100%**	**151 dn**	**2014-09-19**	**2015-03-13**	
2085	**6.3.2**		**Konstrukcja nośna kotła i paleniska linii 2**	**100%**	**157 dn**	**2014-09-19**	**2015-03-20**	
2088	**6.3.3**		**Palenisko rusztowe linii 1 wraz ze stacją hydrauliczną**	**82%**	**411 dn**	**2014-10-14**	**2016-02-03**	
2089	6.3.3.1		Układ podawania paliwa	69%	154 dn	2015-07-17	2016-02-03	2029RR;1894RF
2090	6.3.3.2		Układ spalania wraz z rusztem	100%	109 dn	2014-10-14	2015-03-13	2030RR;2083RF
2091	**6.3.4**		**Palenisko rusztowe linii 2 wraz ze stacją hydrauliczną**	**82%**	**405 dn**	**2014-10-21**	**2016-02-03**	
2092	6.3.4.1		Układ podawania paliwa	69%	154 dn	2015-07-17	2016-02-03	2032RR;2087RF
2093	6.3.4.2		Układ spalania wraz z rusztem	100%	109 dn	2014-10-21	2015-03-20	2033RR;2086RF
2094	6.3.5		Odżużlacz linii 1 wraz z osprzętem	100%	101 dn	2014-10-10	2015-02-27	2034;2083RR+1
2095	6.3.6		Odżużlacz linii 2 wraz z osprzętem	100%	96 dn	2014-10-17	2015-02-27	2035;2086RR;2
2096	**6.3.7**		**Walczakowy kocioł parowy linii 1**	**89%**	**542 dn**	**2014-10-09**	**2016-06-30**	
2097	6.3.7.1		Podparcia kotła i rur opadowych	100%	102 dn	2014-10-09	2015-02-27	2037;2083RR+1
2098	6.3.7.2		Ściana boczna prawa I,II,III ciągu	100%	71 dn	2014-11-14	2015-02-20	2038;2097RR;2
2099	6.3.7.3		Ściana boczna lewa I,II,III ciągu	100%	64 dn	2014-11-25	2015-02-20	2039;2098RR+7
2100	6.3.7.4		Ściana przednia i tylna I ciągu	100%	57 dn	2014-12-04	2015-02-20	2040;2099RR+7
2101	6.3.7.5		Ściany tylne II, III ciągu, strop I,II,III ciąg	100%	50 dn	2014-12-15	2015-02-20	2041;2100RR+7
2102	6.3.7.6		Ściany boczne, strop i przegrody IV ciągu	100%	86 dn	2014-12-24	2015-04-22	2042;2101RR+7
2103	6.3.7.7		Leje popiołowe pod IV ciągiem	100%	89 dn	2014-12-26	2015-04-29	2043;2083RR+7
2104	6.3.7.8		Pęczki parowników EVAP 1 i EVAP 2	100%	37 dn	2015-01-26	2015-03-17	2044;2101RR+3
2105	6.3.7.9		ECO 1, 2, 3	100%	14 dn	2015-02-10	2015-02-27	2045;2102RR;2
2106	6.3.7.10		Walczak	100%	4 dn	2015-02-12	2015-02-17	2046;2083RR;2
2107	6.3.7.11		Rury opadowe	100%	16 dn	2015-01-30	2015-02-20	2047;2097ZR-2
2108	6.3.7.12		Rurociągi wznoszące	100%	59 dn	2015-03-10	2015-05-29	2048;2107ZR+1

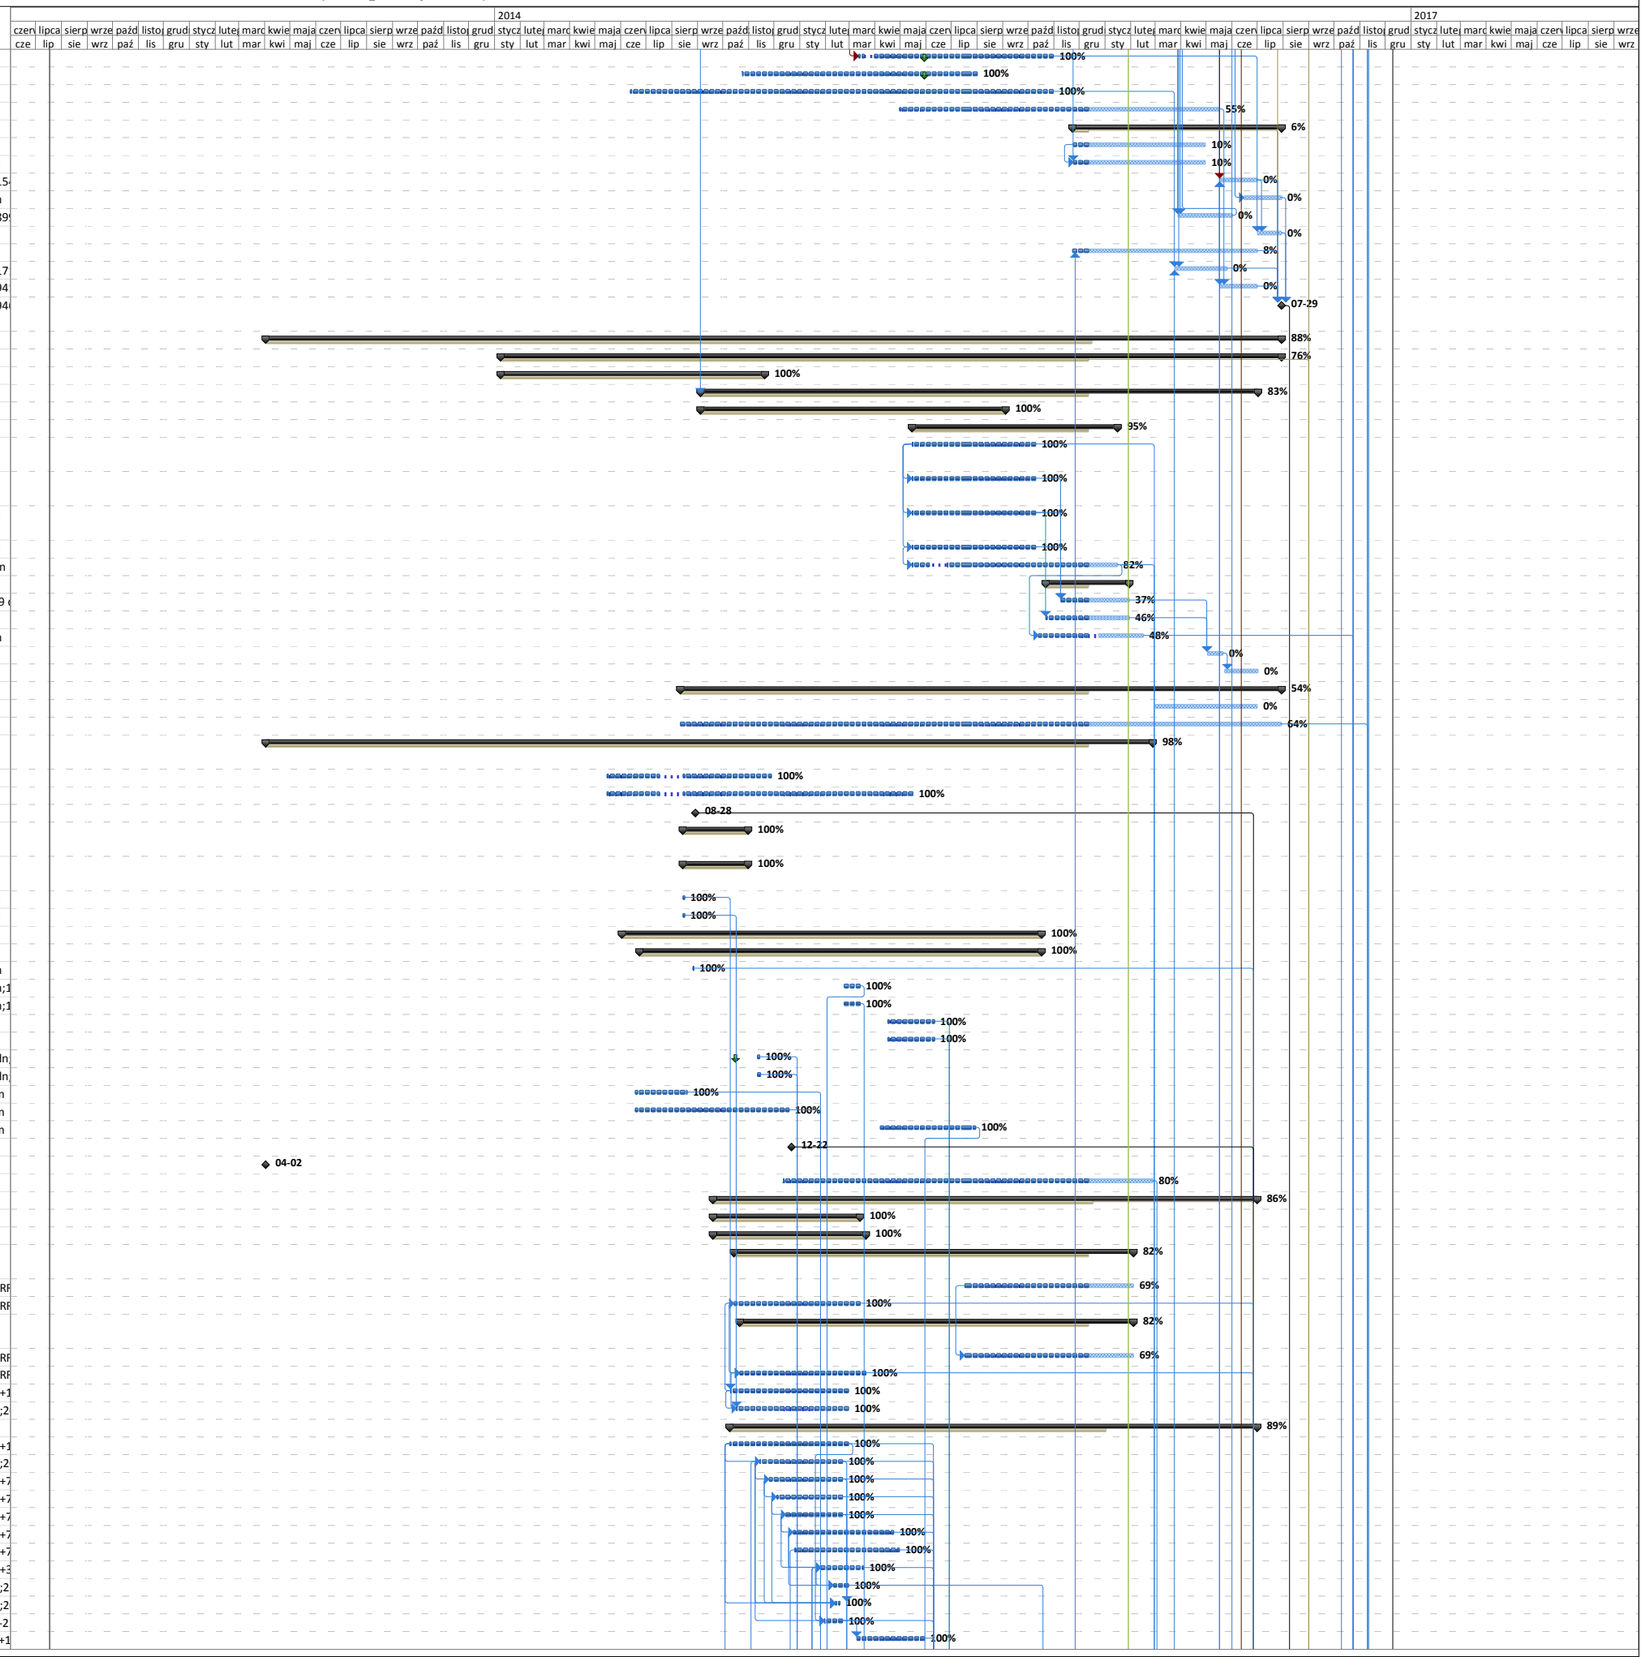

Id.	Pozycja Planu Płatności	Nr projektu	Nazwa zadania	Wykona %	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki
2109	6.3.7.13		Kanał spalin za IV ciagiem	100%	10 dn	2015-10-19	2015-10-30	2049;2105ZR+3
2110	6.3.7.14		Strzepywacze popiołu	91%	126 dn	2015-07-07	2015-12-23	2050
2111	6.3.7.15		Zraszacze	67%	131 dn	2015-08-12	2016-01-29	2051ZR+21 dn
2112	6.3.7.16		Obmurze	36%	83 dn	2016-03-21	2016-06-30	1224;2700
2113	**6.3.8**		**Walczakowy kocioł parowy linii 2**	**89%**	**525 dn**	**2014-10-29**	**2016-06-30**	
2114	6.3.8.1		Podparcia kotła i rur opadowych	100%	88 dn	2014-10-29	2015-02-27	2053;2086RR+1
2115	6.3.8.2		Ściana boczna prawa I,II,III ciągu	100%	71 dn	2014-11-14	2015-02-20	2054;2086RR;2
2116	6.3.8.3		Ściana boczna lewa I,II,III ciągu	100%	64 dn	2014-11-25	2015-02-20	2055;2115RR+7
2117	6.3.8.4		Ściana przednia i tylna I ciągu	100%	57 dn	2014-12-04	2015-02-20	2056;2116RR+7
2118	6.3.8.5		Ściany tylne II, III ciągu, strop I,II,III ciąg	100%	84 dn	2015-01-02	2015-04-29	2057;2117RR+2
2119	6.3.8.6		Ściany boczne, strop i przegrody IV ciągu	100%	77 dn	2015-01-13	2015-04-29	2058;2118RR+7
2120	6.3.8.7		Leje popiołowe pod IV ciągiem	100%	79 dn	2015-01-09	2015-04-29	2059;2086RR+4
2121	6.3.8.8		Pęczki parowników EVAP 1 i EVAP 2	100%	23 dn	2015-03-03	2015-04-15	2060ZR-21 dn;2
2122	6.3.8.9		ECO 1, 2, 3	100%	65 dn	2015-03-02	2015-05-29	2061;2121RR-1
2123	6.3.8.10		Walczak	100%	3 dn	2015-02-13	2015-02-17	2086RR;2114RF
2124	6.3.8.11		Rury opadowe	100%	15 dn	2015-01-30	2015-02-19	2114ZR-21 dn;2
2125	6.3.8.12		Rurociągi wznoszące	100%	50 dn	2015-03-23	2015-05-29	2064;2124ZR+2
2126	6.3.8.13		Kanał spalin za IV ciagiem	100%	10 dn	2015-10-19	2015-10-30	2065;2122
2127	6.3.8.14		Strzepywacze popiołu	91%	126 dn	2015-07-07	2015-12-23	2066
2128	6.3.8.15		Zraszacze	67%	131 dn	2015-08-12	2016-01-29	2067;2111RR
2129	6.3.8.16		Obmurze	29%	84 dn	2016-03-21	2016-06-30	1224;2701
2130	6.3.9		System powietrza pierwotnego i wtórnego linii 1	88%	248 dn	2015-02-13	2016-01-15	2069;2098;209
2131	6.3.10		System powietrza pierwotnego i wtórnego linii 2	86%	228 dn	2015-03-13	2016-01-15	2070ZR-1 dzień
2132	6.3.11		Zespół palników olejowych rozruchowo-wspomag	100%	21 dn	2015-06-29	2015-07-24	2071;2700ZR+1
2133	6.3.12		Zespół palników olejowych rozruchowo-wspomag	100%	12 dn	2015-06-29	2015-07-14	2072;2701ZR-1
2134	6.3.13		Zespół podgrzewacza powietrza pierwotnego linii	93%	269 dn	2014-12-29	2015-12-31	2073ZR+31 dn
2135	6.3.14		Zespół podgrzewacza powietrza pierwotnego linii	93%	269 dn	2014-12-29	2015-12-31	2074ZR+30 dn
2136	6.3.15		Przegrzewacz pary linii 1	100%	32 dn	2015-01-26	2015-03-10	2075;2104RR
2137	6.3.16		Przegrzewacz pary linii 2	100%	42 dn	2015-01-26	2015-03-24	2076;2104RR
2138	6.3.17		Układ wody zasilającej+ZWZ	53%	255 dn	2015-06-10	2016-04-29	2077ZR-37 dn
2139	6.3.18		Instalacje przykotłowe	54%	262 dn	2015-06-01	2016-04-29	
2140			Zakończenie montażu kotła - część ciśnieniowa - lini	100%	0 dn	2015-06-10	2015-06-10	
2141			Zakończenie montażu kotła - część ciśnieniowa - lini	100%	0 dn	2015-06-29	2015-06-29	
2142			Zakończenie montażu kotła	0%	0 dn	2016-06-30	2016-06-30	2081;2139;214
2143	6.3.19		Montaż suwnicy nad bunkrem żużla	0%	27 dn	2016-02-29	2016-03-30	2080;2010;201
2144	**7**		**Segment wytwarzania energii: A.4, A.7, A.12, A.13, A.14, A.17**	**47%**	**794 dn**	**2014-03-06**	**2016-09-15**	
2145	**7.1**		**Roboty budowlane**	**58%**	**692 dn**	**2014-05-16**	**2016-07-29**	
2146	**7.1.1**		**Fundamenty**	**79%**	**692 dn**	**2014-05-16**	**2016-07-29**	
2147	**7.1.1.1**		**Wykop**	**100%**	**224 dn**	**2014-05-28**	**2015-02-13**	
2150	**7.1.1.2**		**Kolumny wzmacniające**	**100%**	**238 dn**	**2014-05-16**	**2015-02-17**	
2153	7.1.1.3		wykonanie płyty fudamentowej wraz ze zbrojeniem - maszynownia A.7	100%	70 dn	2015-01-13	2015-04-20	74;71
2154	7.1.1.4		wykonanie płyty fudamentowej wraz ze zbrojeniem - A.4, A.12, A.13, A.14 i A.17	85%	237 dn	2015-03-09	2016-01-29	92;95;104;2152 dn
2155	7.1.1.5		kolumny pod turbinę	100%	13 dn	2015-04-21	2015-05-07	74;2153
2156	7.1.1.6		płyta posadzkowa poziom +0,00 - maszynownia	41%	335 dn	2015-06-08	2016-07-29	74;2158;2155ZI
2157	7.1.1.7		zbrojenie ścian maszynowni A.7 do poziomu +0	100%	73 dn	2015-01-22	2015-05-04	2153RR+7 dn
2158	7.1.1.8		betonowanie ścian maszynowni A.7 do poziom	100%	92 dn	2015-01-22	2015-05-29	2157RR
2159	**7.1.2**		**Konstrukcja budynku**	**50%**	**387 dn**	**2015-05-07**	**2016-07-29**	
2160	**7.1.2.2**		**Betonowanie ścian - A.4, A.12, A.13, A.14, A.1**	**84%**	**210 dn**	**2015-05-18**	**2016-01-15**	**71;92;95;104**
2161	7.1.2.2.1		Ściany, słupy do poziomu +0,00	100%	5 dn	2015-05-28	2015-06-03	
2162	7.1.2.2.2		Strop na poziomie +0,00	100%	8 dn	2015-05-18	2015-05-27	2161ZR-13 dn
2163	7.1.2.2.3		Ściany, słupy do poziomu +3,80	100%	5 dn	2015-06-18	2015-06-24	
2164	7.1.2.2.4		Strop na poziomie +3,80	100%	23 dn	2015-06-26	2015-07-27	2163ZR+1 dzień
2165	7.1.2.2.5		Ściany, słupy do poziomu +6,25	100%	19 dn	2015-07-28	2015-08-21	2164
2166	7.1.2.2.6		Strop na poziomie +6,25	100%	20 dn	2015-08-17	2015-09-11	2165ZR-5 dn
2167	7.1.2.2.7		Ściany, słupy do poziomu +10,625	100%	5 dn	2015-09-14	2015-09-18	2166
2168	7.1.2.2.8		Strop na poziomie +10,625	100%	35 dn	2015-09-14	2015-10-30	2167ZR-5 dn
2169	7.1.2.2.9		Ściany, słupy do poziomu +14,40	100%	31 dn	2015-10-12	2015-11-23	
2170	7.1.2.2.10		Strop na poziomie +14,40	31%	45 dn	2015-11-24	2016-01-15	2169
2171	7.1.2.3		Klatka schodowa SCH2 od poziomu +0,00 pomiędzy osiami "18" i "20" oraz "B1" i "B2"	81%	194 dn	2015-05-07	2016-01-29	2162ZR-15 dn
2172	7.1.2.4		Klatka schodowa SCH3 od poziomu +0,00 pomiędzy osiami "18" i "20" oraz "F1" i "G1"	82%	137 dn	2015-07-10	2016-01-08	
2173	7.1.2.5		Konstrukcja stalowa budynku A.7	56%	98 dn	2015-09-28	2016-01-29	2158;469ZR-20
2174	7.1.2.6		Konstrukcja dachu budynku A.7	76%	72 dn	2015-09-28	2015-12-30	2173RR;469ZR-
2175	7.1.2.7		Elewacja	0%	95 dn	2016-02-01	2016-05-20	2160ZR-35 dn;2
2176	7.1.2.8		Pokrycie dachowe (Budynek A4, A7, A12, A13, A14, A17)	0%	95 dn	2016-02-01	2016-05-20	2160;478;591;6
2177	7.1.2.9		Stolarka okienna i drzwiowa	0%	41 dn	2016-03-14	2016-04-29	478;591;616;68
2178	7.1.2.10		Wykończenie	15%	234 dn	2015-10-26	2016-07-29	
2179	**7.1.3**		**Instalacje**	**22%**	**300 dn**	**2015-08-17**	**2016-07-29**	
2180	7.1.3.1		Instalacje wentylacji i ogrzewania	0%	101 dn	2016-04-04	2016-07-29	481;619;685;21
2181	7.1.3.2		Instalacje wod-kan	30%	284 dn	2015-08-17	2016-07-29	484;622;688
2182	**7.2**		**Zamówienie, dostawa wraz z akceptacją dokumentacji przez Zamawiającego**	**58%**	**756 dn**	**2014-03-06**	**2016-08-02**	
2183	7.2.1		Turbina kondensacyjno- upustowa i klapa gazoszc	100%	322 dn	2014-03-06	2015-05-29	
2184	7.2.1.1		Inspekcja turbiny	100%	1 dzień	2015-05-29	2015-05-29	2183ZR-1 dzień
2185	7.2.2		Generator synchroniczny	100%	322 dn	2014-03-06	2015-05-29	2183RR
2186	7.2.2.1		Inspekcja generatora	100%	1 dzień	2015-05-29	2015-05-29	2185ZR-1 dzień
2187	7.2.3		Kondensator chłodzony wodą	100%	322 dn	2014-03-06	2015-05-29	2185RR
2188	7.2.4		Zespół instalacji olejowej turbozespołu	100%	322 dn	2014-03-06	2015-05-29	2187RR
2189	7.2.4.1		Inspekcja zbiornika olejowego wraz z osprzętem	100%	1 dzień	2015-05-29	2015-05-29	2188ZR-1 dzień
2190	**7.2.5**		**Urządzenia gospodarki kondensatem i wodą zasilającą**	**27%**	**398 dn**	**2015-02-24**	**2016-05-31**	**1282ZR-90 dn**
2191	7.2.5.1		Pompy wody zasilającej	100%	24 dn	2015-02-24	2015-06-25	
2192	7.2.5.2		Rurociągi wody zasilającej	0%	65 dn	2016-01-18	2016-04-01	
2193	7.2.5.3		Armatura i instalacje wody zasilającej	0%	113 dn	2016-01-18	2016-05-27	
2194	7.2.5.4		Rurociągi kondensatu i powrotu skroplin	0%	80 dn	2016-02-29	2016-05-31	
2195	7.2.5.5		Armatura instalacji kondensatu i powrotu skrop	0%	104 dn	2016-01-28	2016-05-27	

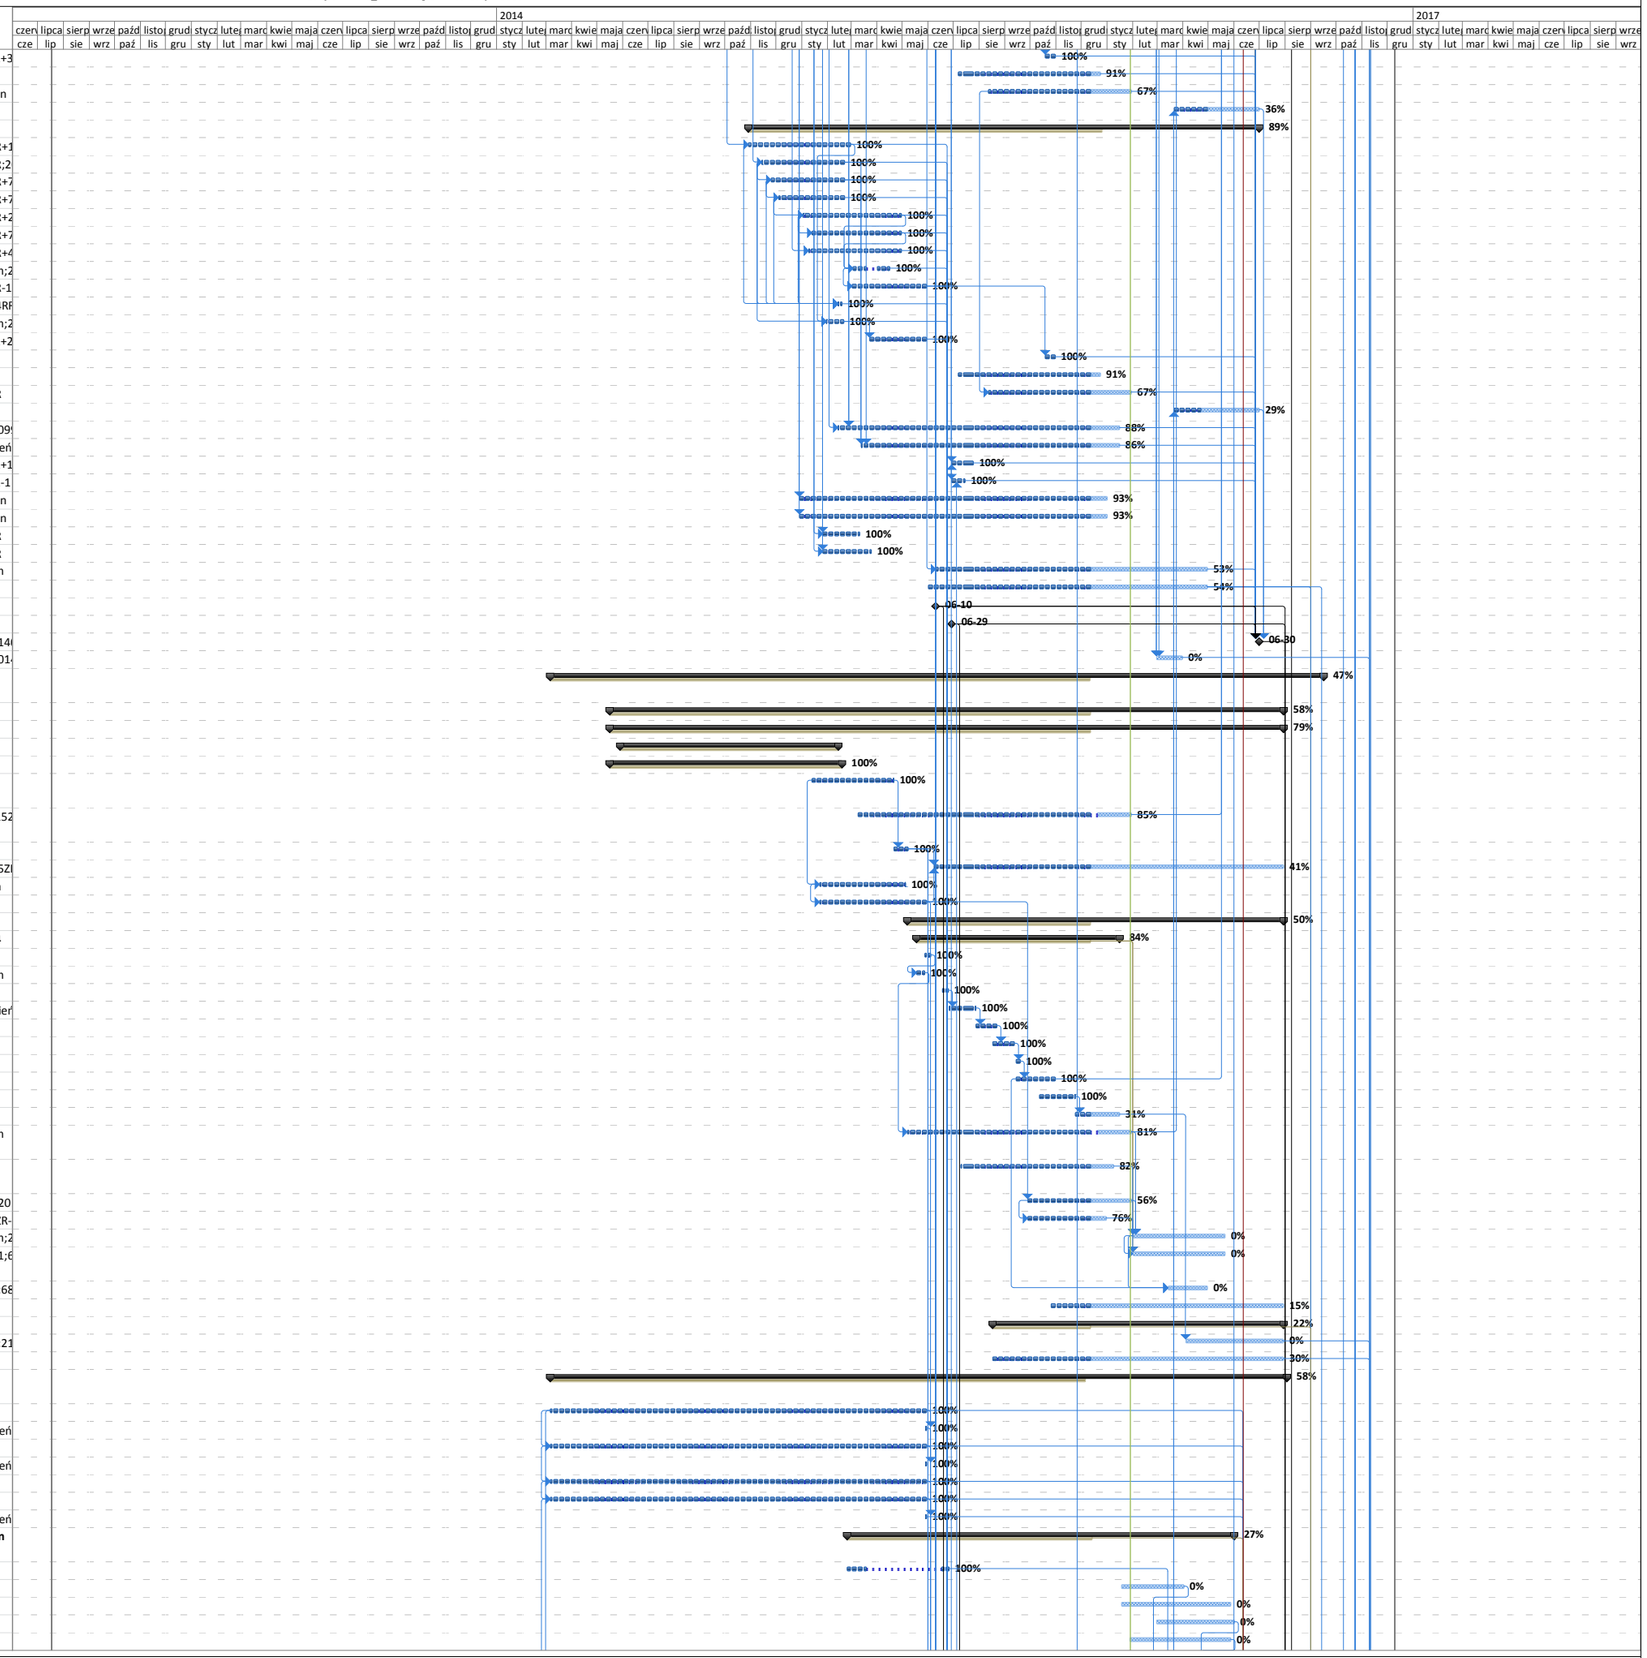

Id.	Pozycja Planu Płatności	Nr projektu	Nazwa zadania	Wykona %	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki
2196	7.2.5.6		Pompy skroplin z wymienników ciepłowniczych	100%	17 dn	2015-08-31	2015-09-22	
2197	7.2.5.7		Pompy skroplin ze zbiornika kondensatu czyste	0%	64 dn	2016-02-15	2016-04-28	
2198	7.2.5.8		Zbiornik kondensatu czystego	100%	72 dn	2015-02-24	2015-09-29	
2199	7.2.5.9		Rozprężacz spustu i odwodnień	100%	72 dn	2015-02-24	2015-09-29	
2200	7.2.5.10		Izolacja	0%	65 dn	2016-03-14	2016-05-27	
2201	7.2.6		Osłona dźwiękochłonna	68%	666 dn	2014-03-06	2016-08-02	2188RR
2202	**7.2.7**		**Przyłącze i rurociągi wody chłodzącej**	**27%**	**264 dn**	**2015-08-14**	**2016-06-15**	**1272ZR+82 dn**
2203	**7.2.7.1**		**Układ otwarty wody chłodzącej**	**21%**	**209 dn**	**2015-09-29**	**2016-05-27**	
2204	7.2.7.1.1		Rurociągi otwartego układu wody chłodzącej kondensator w maszynowni	0%	74 dn	2016-01-28	2016-04-22	
2205	7.2.7.1.2		Armatura ukł. wody chłodzącej w maszynow	0%	104 dn	2016-01-28	2016-05-27	
2206	7.2.7.1.3		Urządzenia ukł. czyszczenia rurek kondensatora kulkami gąbczastymi	64%	85 dn	2015-09-29	2016-01-15	
2207	**7.2.7.2**		**Układ zamknięty wody chłodzącej**	**32%**	**264 dn**	**2015-08-14**	**2016-06-15**	
2208	7.2.7.2.1		Chłodnia wentylatorowa	100%	73 dn	2015-08-14	2015-11-24	
2209	7.2.7.2.2		Pompy wody chłodzącej ukł. zamkniętego	0%	64 dn	2016-02-15	2016-04-28	
2210	7.2.7.2.3		Zbiornik wody uzupełniającej	100%	67 dn	2015-08-28	2015-11-30	
2211	7.2.7.2.4		Pompy wody uzupełniającej ukł. zamkniętego	0%	45 dn	2016-02-15	2016-04-06	
2212	7.2.7.2.5		Rurociągi zamkniętego ukł. wody chłodzącej	0%	74 dn	2016-01-28	2016-04-22	
2213	7.2.7.2.6		Armatura zamkniętego ukł. wody chłodzącej	0%	120 dn	2016-01-28	2016-06-15	
2214	**7.2.8**		**Układ pary świeżej**	**9%**	**212 dn**	**2015-09-29**	**2016-05-31**	**1244ZR-30 dn;2**
2215	7.2.8.1		Rurociągi pary świeżej	0%	104 dn	2016-01-28	2016-05-27	
2216	7.2.8.2		Stacje redukcyjno - schładzające	100%	43 dn	2015-09-29	2015-11-26	
2217	7.2.8.3		Rurociągi upustowe i rurociąg zrzutowy	0%	104 dn	2016-01-28	2016-05-27	
2218	7.2.8.4		Armatura i instalacje pary świeżej	0%	104 dn	2016-01-28	2016-05-27	
2219	7.2.8.5		Rurociągi wydmuchowe	0%	80 dn	2016-02-29	2016-05-31	
2220	7.2.8.6		Izolacja	0%	65 dn	2016-03-14	2016-05-27	
2221	**7.2.9**		**Układ chemicznej korekcji wody**	**0%**	**77 dn**	**2016-02-29**	**2016-05-27**	
2222	7.2.9.1		Urządzenia ukł. chemicznej korecji wody kotłowej, kondensatu i wody chłodzącej	0%	77 dn	2016-02-29	2016-05-27	
2223	7.2.9.2		Rurociągi ukł. chemicznej korecji wody kotłowej, kondensatu i wody chłodzącej	0%	77 dn	2016-02-29	2016-05-27	
2224	7.2.10		Suwnica w maszynowni	100%	307 dn	2014-08-29	2015-10-30	
2225			Zamówienie, dostawa wraz z akceptacją dokumentacji przez Zamawiajacego	0%	0 dn	2016-06-15	2016-06-15	2183;2185;218
2226	**7.3**		**Montaż**	**21%**	**407 dn**	**2015-06-01**	**2016-09-15**	
2227	7.3.1		Turbina kondensacyjno- upustowa	49%	289 dn	2015-06-01	2016-05-31	2184;2155
2228	7.3.2		Generator synchroniczny	49%	289 dn	2015-06-01	2016-05-31	2227RR;2185
2229	7.3.3		Kondensator chłodzony wodą	49%	289 dn	2015-06-01	2016-05-31	2187;2155ZR+5
2230	7.3.4		Zespół instalacji olejowej turbozespołu	49%	289 dn	2015-06-01	2016-05-31	2188
2231	**7.3.5**		**Urządzenia gospodarki kondensatem i wodą zasilającą**	**0%**	**108 dn**	**2016-02-29**	**2016-07-02**	
2232	7.3.5.1		Pompy wody zasilającej	0%	30 dn	2016-03-14	2016-04-16	2191
2233	7.3.5.2		Rurociągi wody zasilającej	0%	101 dn	2016-03-07	2016-07-01	2192ZR-25 dn
2234	7.3.5.3		Armatura i instalacje wody zasilającej	0%	101 dn	2016-03-07	2016-07-01	2233RR
2235	7.3.5.4		Rurociągi kondensatu i powrotu skroplin	0%	53 dn	2016-05-03	2016-07-02	2194ZR-25 dn
2236	7.3.5.5		Armatura instalacji kondensatu i powrotu skrop	0%	53 dn	2016-05-03	2016-07-02	2195ZR-25 dn
2237	7.3.5.6		Pompy skroplin z wymienników ciepłowniczych	0%	30 dn	2016-03-14	2016-04-16	2196;2232RR
2238	7.3.5.7		Pompy skroplin ze zbiornika kondensatu czyste	0%	30 dn	2016-04-29	2016-06-02	2197
2239	7.3.5.8		Zbiornik kondensatu czystego	0%	45 dn	2016-02-29	2016-04-20	2198
2240	7.3.5.9		Rozprężacz spustu i odwodnień	0%	45 dn	2016-03-31	2016-05-21	2199
2241	7.3.5.10		Izolacja	0%	78 dn	2016-06-01	2016-08-30	2200ZR-15 dn
2242	7.3.6		Osłona dźwiękochłonna	0%	30 dn	2016-08-12	2016-09-15	2201
2243	**7.3.7**		**Przyłącze i rurociągi wody chłodzącej**	**0%**	**178 dn**	**2015-12-21**	**2016-07-14**	
2244	**7.3.7.1**		**Układ otwarty wody chłodzącej**	**0%**	**65 dn**	**2016-03-28**	**2016-06-10**	
2245	7.3.7.1.1		Rurociągi otwartego układu wody chłodzące	0%	65 dn	2016-03-28	2016-06-10	2204ZR-30 dn
2246	7.3.7.1.2		Armatura ukł. wody chłodzącej w maszynow	0%	65 dn	2016-03-28	2016-06-10	2205ZR-60 dn
2247	7.3.7.1.3		Urządzenia ukł. czyszczenia rurek kondensat	0%	65 dn	2016-03-28	2016-06-10	2206
2248	**7.3.7.2**		**Układ zamknięty wody chłodzącej**	**0%**	**178 dn**	**2015-12-21**	**2016-07-14**	
2249	7.3.7.2.1		Chłodnia wentylatorowa	0%	15 dn	2016-03-07	2016-03-23	2208
2250	7.3.7.2.2		Pompy wody chłodzącej ukł. zamkniętego	0%	25 dn	2016-05-02	2016-05-30	2209
2251	7.3.7.2.3		Zbiornik wody uzupełniającej	0%	81 dn	2015-12-21	2016-03-23	2210
2252	7.3.7.2.4		Pompy wody uzupełniającej ukł. zamkniętego	0%	25 dn	2016-04-07	2016-05-05	2211
2253	7.3.7.2.5		Rurociągi zamkniętego ukł. wody chłodzącej	0%	70 dn	2016-04-25	2016-07-14	2212
2254	7.3.7.2.6		Armatura zamkniętego ukł. wody chłodzące	0%	70 dn	2016-04-25	2016-07-14	2253RR
2255	**7.3.8**		**Układ pary świeżej**	**0%**	**107 dn**	**2016-03-14**	**2016-07-15**	
2256	7.3.8.1		Rurociągi pary świeżej	0%	80 dn	2016-04-05	2016-07-06	2215ZR-46 dn
2257	7.3.8.2		Stacje redukcyjno - schładzające	0%	80 dn	2016-04-05	2016-07-06	2216ZR+112 dn
2258	7.3.8.3		Rurociągi upustowe i rurociąg zrzutowy	0%	107 dn	2016-03-14	2016-07-15	2217ZR-90 dn
2259	7.3.8.4		Armatura i instalacje pary świeżej	0%	80 dn	2016-04-05	2016-07-06	2218ZR-50 dn
2260	7.3.8.5		Rurociągi wydmuchowe	0%	53 dn	2016-05-16	2016-07-15	2219ZR-45 dn
2261	7.3.8.6		Izolacja	0%	50 dn	2016-07-04	2016-08-30	2220
2262	**7.3.9**		**Układ chemicznej korekcji wody**	**0%**	**26 dn**	**2016-06-01**	**2016-06-30**	**2222**
2263	7.3.9.1		Urządzenia ukł. chemicznej korecji wody kotłowej, kondensatu i wody chłodzącej	0%	26 dn	2016-06-01	2016-06-30	
2264	7.3.9.2		Rurociągi ukł. chemicznej korecji wody kotłowej, kondensatu i wody chłodzącej	0%	26 dn	2016-06-01	2016-06-30	
2265	7.3.10		Suwnica w maszynowni	100%	21 dn	2015-11-02	2015-11-30	2224
2266			Zakończenie montażu turbozespołu bez osłony dźwiękochłonnej i izolacji	0%	0 dn	2016-07-15	2016-07-15	2227;2228;222
2267	**8**		**Segment sieci ciepłowniczej: A.8, A.11, B.1**	**28%**	**516,4 dn**	**2014-12-26**	**2016-08-18**	
2268	**8.1**		**Roboty budowlane**	**25%**	**499,4 dn**	**2014-12-26**	**2016-07-29**	
2269	8.1.1		Wykopy/nasypy oraz wykonanie platform roboczy	100%	25 dn	2014-12-26	2015-01-30	2149ZR-100 dn
2270	8.1.2		Wzmocnienie gruntu/ palowanie etap 2	100%	1 dzień	2015-01-30	2015-02-02	2269
2271	**8.1.3**		**Fundamenty budynków i estakady A.8, A.11, B.1**	**41%**	**236 dn**	**2015-06-01**	**2016-02-29**	**80;89**
2272	8.1.3.1		Fundamenty budynków	100%	46 dn	2015-06-01	2015-07-31	2270;2158
2273	8.1.3.2		Fundamenty estakady+palowanie	3%	71 dn	2015-12-10	2016-02-29	80;89;292;273
2274	**8.1.4**		**Prace konstrukcyjno-budowlane budynków A.8 i**	**30%**	**279 dn**	**2015-09-10**	**2016-07-29**	
2275	8.1.4.1		Konstrukcja stalowa budynków	61%	110 dn	2015-09-10	2016-01-29	
2276	8.1.4.2		Konstrukcja dachu budynków	61%	110 dn	2015-09-10	2016-01-29	2275RR
2277	8.1.4.3		Elewacja	0%	59 dn	2016-03-21	2016-05-27	2276ZR+43 dn

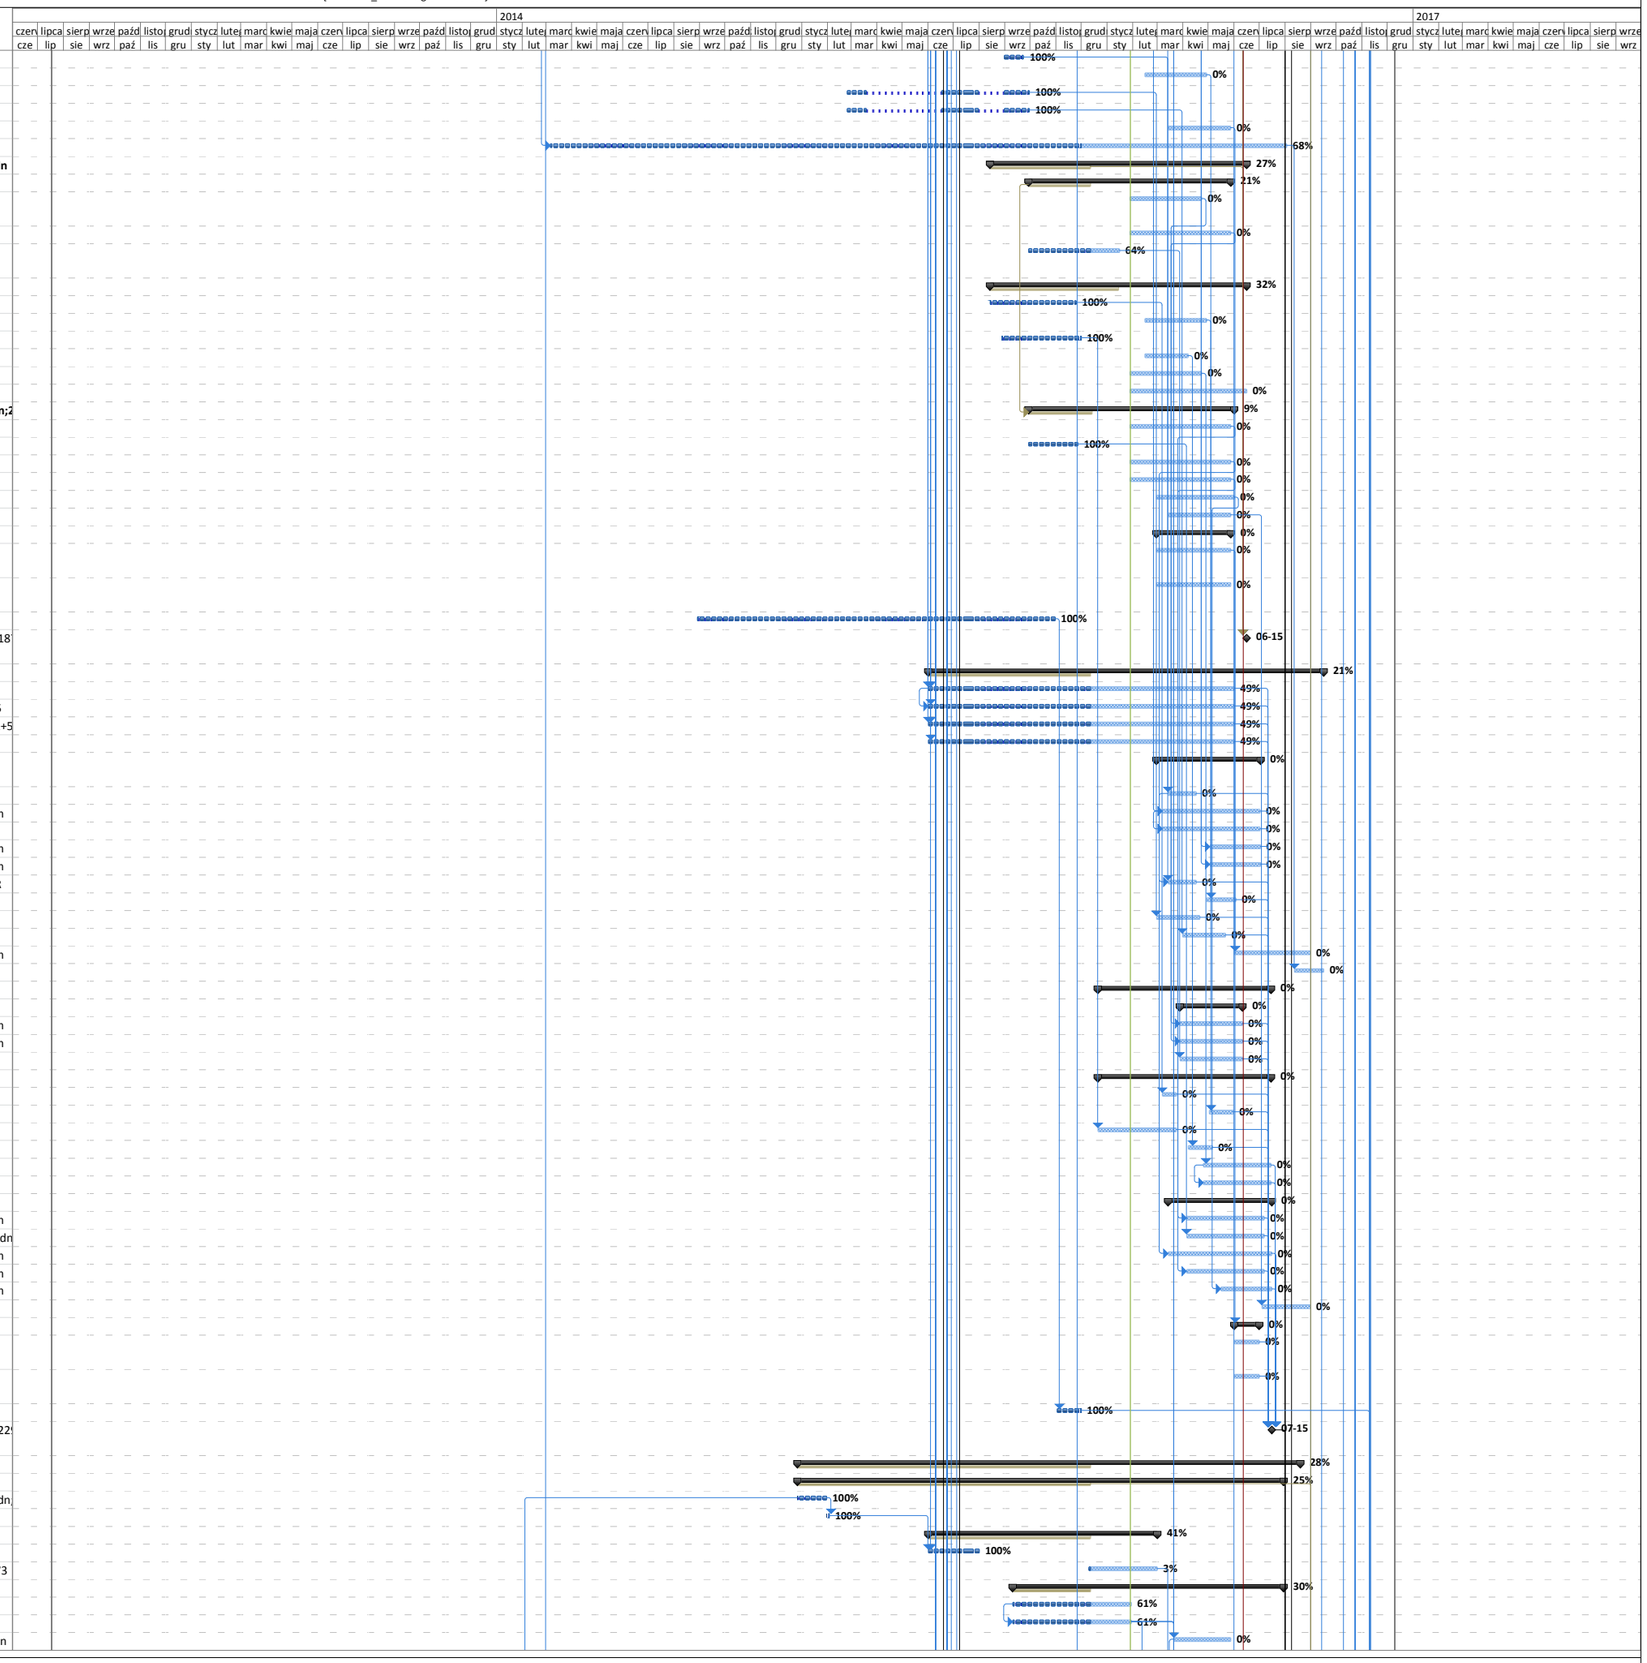

Id.	Pozycja Planu Płatności	Nr projektu	Nazwa zadania	Wykona %	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki
2278	8.1.4.5		Pokrycie dachowe	0%	61 dn	2016-02-12	2016-04-22	2276ZR+9 dn
2279	8.1.4.6		Stolarka okienna i drzwiowa	0%	23 dn	2016-04-04	2016-04-29	2277RR-5 dn;22
2280	8.1.4.7		Wykończenie	0%	77 dn	2016-05-02	2016-07-29	2278RR;2279RR
2281	8.1.5		Konstrukcja stalowa estakady B.1	0%	35 dn	2016-03-14	2016-04-22	2273
2282	**8.1.6**		**Instalacje**	**0%**	**113 dn**	**2016-03-21**	**2016-07-29**	
2283	8.1.6.1		Instalacje wentylacji i ogrzewania	0%	94 dn	2016-03-21	2016-07-07	569;2276ZR+35
2284	8.1.6.2		Instalacje wod-kan	0%	113 dn	2016-03-21	2016-07-29	572;509
2285	**8.2**		**Zamówienie, dostawa wraz z akceptacją dokumentacji przez Zamawiającego**	**48%**	**315 dn**	**2015-04-30**	**2016-04-29**	
2286	8.2.1		Zestaw wymienników ciepłowniczych ZTUO	57%	284 dn	2015-04-30	2016-04-29	2183RR
2287	8.2.2		Rurociąg ciepłowniczy do granicy działki ZTUO	0%	55 dn	2016-02-12	2016-04-15	1319
2288	**8.3**		**Montaż**	**0%**	**120 dn**	**2016-04-01**	**2016-08-18**	**2285RR**
2289	8.3.1		Zestaw wymienników ciepłowniczych	0%	94 dn	2016-05-02	2016-08-18	2286
2290	8.3.2		Rurociąg ciepłowniczy do granicy działki ZTUO	0%	78 dn	2016-04-01	2016-06-30	2287ZR-15 dn
2291			Zakres Zamawiającego: Wykonanie pompowni wody ciepłowniczej	0%	0 dn	2016-06-27	2016-06-27	
2292			Zakres Zamawiającego: gotowość do podania wody ciepłej do rurociągu SEC	0%	0 dn	2016-10-10	2016-10-10	
2293			Zakończenie segmentu sieci ciepłowniczej	0%	0 dn	2016-08-18	2016-08-18	2289;2290
2294	**9**		**Segment wyprowadzenia mocy elektrycznej: C.2**	**3%**	**348 dn**	**2015-07-24**	**2016-08-31**	
2295	**9.1**		**Roboty budowlane**	**0%**	**89 dn**	**2016-01-11**	**2016-04-22**	
2296	9.1.1		Fundamenty/ Fundament pod agregat	0%	17 dn	2016-01-11	2016-01-29	
2297	9.1.2		Prace konstrukcyjno-budowlane budynków	0%	71 dn	2016-02-01	2016-04-22	2296
2298	**9.2**		**Zamówienie, dostawa wraz z akceptacją dokumentacji przez Zamawiającego**	**5%**	**332 dn**	**2015-07-24**	**2016-08-12**	
2299	9.2.1		Rozdzielnica SN	100%	91 dn	2015-07-24	2015-11-27	
2300	**9.2.2**		**Rozdzielnice nn**	**0%**	**113 dn**	**2016-01-21**	**2016-05-31**	
2301	9.2.2.1		Rozdzielnica nn - BFA	0%	85 dn	2016-01-21	2016-04-28	1510
2302	9.2.2.2		Rozdzielnica nn - BFB	0%	85 dn	2016-01-21	2016-04-28	1510;2301RR
2303	9.2.2.3		Rozdzielnica nn - BMA, BMB	0%	85 dn	2016-02-23	2016-05-31	1534
2304	9.2.2.4		Rozdzielnica nn - BLE01	0%	98 dn	2016-01-21	2016-05-13	1492
2305	9.2.2.5		Rozdzielnica nn - BLE02	0%	98 dn	2016-01-21	2016-05-13	1492
2306	9.2.2.6		Rozdzielnica nn - BHA-BHB	0%	85 dn	2016-01-21	2016-04-28	1510
2307	9.2.2.7		Rozdzielnica nn - BHC	0%	98 dn	2016-01-21	2016-05-13	1498
2308	9.2.2.8		Rozdzielnica nn - BJD	0%	98 dn	2016-01-21	2016-05-13	1501
2309	9.2.2.9		Rozdzielnica nn - BLB	0%	98 dn	2016-01-21	2016-05-13	1498
2310	9.2.2.10		Rozdzielnica główna prądu stałego 220 VDC	0%	104 dn	2016-01-21	2016-05-20	
2311	9.2.3		Transformatory dystrybucyjne	0%	132 dn	2016-01-29	2016-06-30	1510
2312	9.2.4		Transformator blokowy	0%	169 dn	2016-01-29	2016-08-12	
2313	9.2.5		Agregat Diesla	0%	105 dn	2016-03-01	2016-06-30	1534;2312RR
2314	**9.2.6**		**Wyprowadzanie mocy z generatora do rozdzielnicy 15 kV**	**0%**	**143 dn**	**2016-01-18**	**2016-07-01**	
2315	9.2.6.1		Most szynowy od generatora do wyłącznika ge	0%	116 dn	2016-01-18	2016-05-31	1326ZR-10 dn
2316	9.2.6.2		Most szynowy od wyłącznika generatora do transformatora blokowego	0%	116 dn	2016-01-18	2016-05-31	1326ZR-10 dn
2317	9.2.6.3		Zespół wyłącznika generatorowego	0%	116 dn	2016-02-18	2016-07-01	1323
2318	9.2.6.4		Zabezpieczenie generatora, układ synchronizacji, układ pomiarowy, układ	0%	116 dn	2016-01-18	2016-05-31	1332;1341;133
2319	**9.3**		**Montaż**	**0%**	**229 dn**	**2015-12-10**	**2016-08-31**	
2320	9.3.1		Rozdzielnica SN	2%	82 dn	2015-12-10	2016-03-31	2299
2321	**9.3.2**		**Rozdzielnice nn**	**0%**	**81 dn**	**2016-04-29**	**2016-08-01**	
2322	9.3.2.1		Rozdzielnica nn - BFA	0%	53 dn	2016-04-29	2016-06-29	2301
2323	9.3.2.2		Rozdzielnica nn - BFB	0%	53 dn	2016-04-29	2016-06-29	2302
2324	9.3.2.3		Rozdzielnica nn - BMA, BMB	0%	53 dn	2016-06-01	2016-08-01	2303
2325	9.3.2.4		Rozdzielnica nn - BLE01	0%	52 dn	2016-05-16	2016-07-14	2304
2326	9.3.2.5		Rozdzielnica nn - BLE02	0%	52 dn	2016-05-16	2016-07-14	2305
2327	9.3.2.6		Rozdzielnica nn - BHA-BHB	0%	61 dn	2016-04-29	2016-07-08	2306
2328	9.3.2.7		Rozdzielnica nn - BHC	0%	40 dn	2016-05-16	2016-06-30	2307
2329	9.3.2.8		Rozdzielnica nn - BJD	0%	26 dn	2016-06-16	2016-07-15	2308
2330	9.3.2.9		Rozdzielnica nn - BLB	0%	25 dn	2016-06-17	2016-07-15	2309
2331	9.3.2.10		Rozdzielnica główna prądu stałego 220 VDC	0%	33 dn	2016-05-27	2016-07-04	2310
2332	9.3.3		Transformatory dystrybucyjne	0%	27 dn	2016-07-01	2016-08-01	2311
2333	9.3.4		Transformator blokowy	0%	14 dn	2016-08-15	2016-08-30	2312
2334	9.3.5		Agregat Diesla	0%	19 dn	2016-07-13	2016-08-03	2313
2335	**9.3.6**		**Wyprowadzanie mocy z generatora do rozdzielnicy 15 kV**	**0%**	**79 dn**	**2016-06-01**	**2016-08-31**	
2336	9.3.6.1		Most szynowy od generatora do wyłącznika	0%	51 dn	2016-06-01	2016-07-29	2315
2337	9.3.6.2		Most szynowy od wyłącznika generatora do transformatora blokowego	0%	51 dn	2016-06-01	2016-07-29	2316
2338	9.3.6.3		Zespół wyłącznika generatorowego	0%	51 dn	2016-07-04	2016-08-31	2317
2339	9.3.6.4		Zabezpieczenie generatora, układ synchronizacji, układ pomiarowy, układ	0%	36 dn	2016-07-21	2016-08-31	2318
2340			Zakres Zamawiającego: Linia Kablowa 15kV do granicy działki	0%	1 dzień	2016-08-29	2016-08-29	
2341			Zakończenie montażu wyprowadzenia mocy elektrycznej i systemu zasilania awaryjnego w obrębie budynków C.1, C.2, C.3, C.4	0%	0 dn	2016-08-31	2016-08-31	2294
2342	**10**		**Segment odprowadzania i oczyszczania spalin oraz systemy odzysku ciepła ze spalin oraz oczyszczania ścieków technologicznych: A.20, A.21, A.22, A.23, G, H, J**	**51%**	**797 dn**	**2014-02-14**	**2016-08-30**	
2343	**10.1**		**Roboty budowlane**	**54%**	**782 dn**	**2014-02-14**	**2016-08-12**	
2344	10.1.1		Roboty ziemne do poziomu platform roboczych	100%	14 dn	2014-02-14	2014-03-05	2269RR
2345	10.1.2		Przygotowanie platform roboczych	100%	14 dn	2014-02-14	2014-03-05	2344RR
2346	10.1.3		Wzmocnienie gruntu/ palowanie etap 2 (A21)	100%	364 dn	2014-03-05	2015-07-24	2344ZR-1 dzień
2347			Wzmocnienie gruntu/ palowanie pod A20	100%	17 dn	2015-12-11	2015-12-29	
2348	10.1.4		Roboty ziemne - wykop do rzędnej docelowej ze skuwaniem pali (A21, A20)	85%	359 dn	2014-10-15	2016-02-12	2346RR+160 dn
2349	**10.1.5**		**Fundamenty hali A.20, A.21, A.22, A.23 i fundam**	**66%**	**441 dn**	**2014-10-22**	**2016-03-17**	
2350	**10.1.5.1**		**Fundamenty hali**	**62%**	**441 dn**	**2014-10-22**	**2016-03-17**	
2351	10.1.5.1.1		chudy beton i zbrojenie płyty A.21, A.22, A.2	100%	131 dn	2014-10-22	2015-04-22	2348RR+5 dn

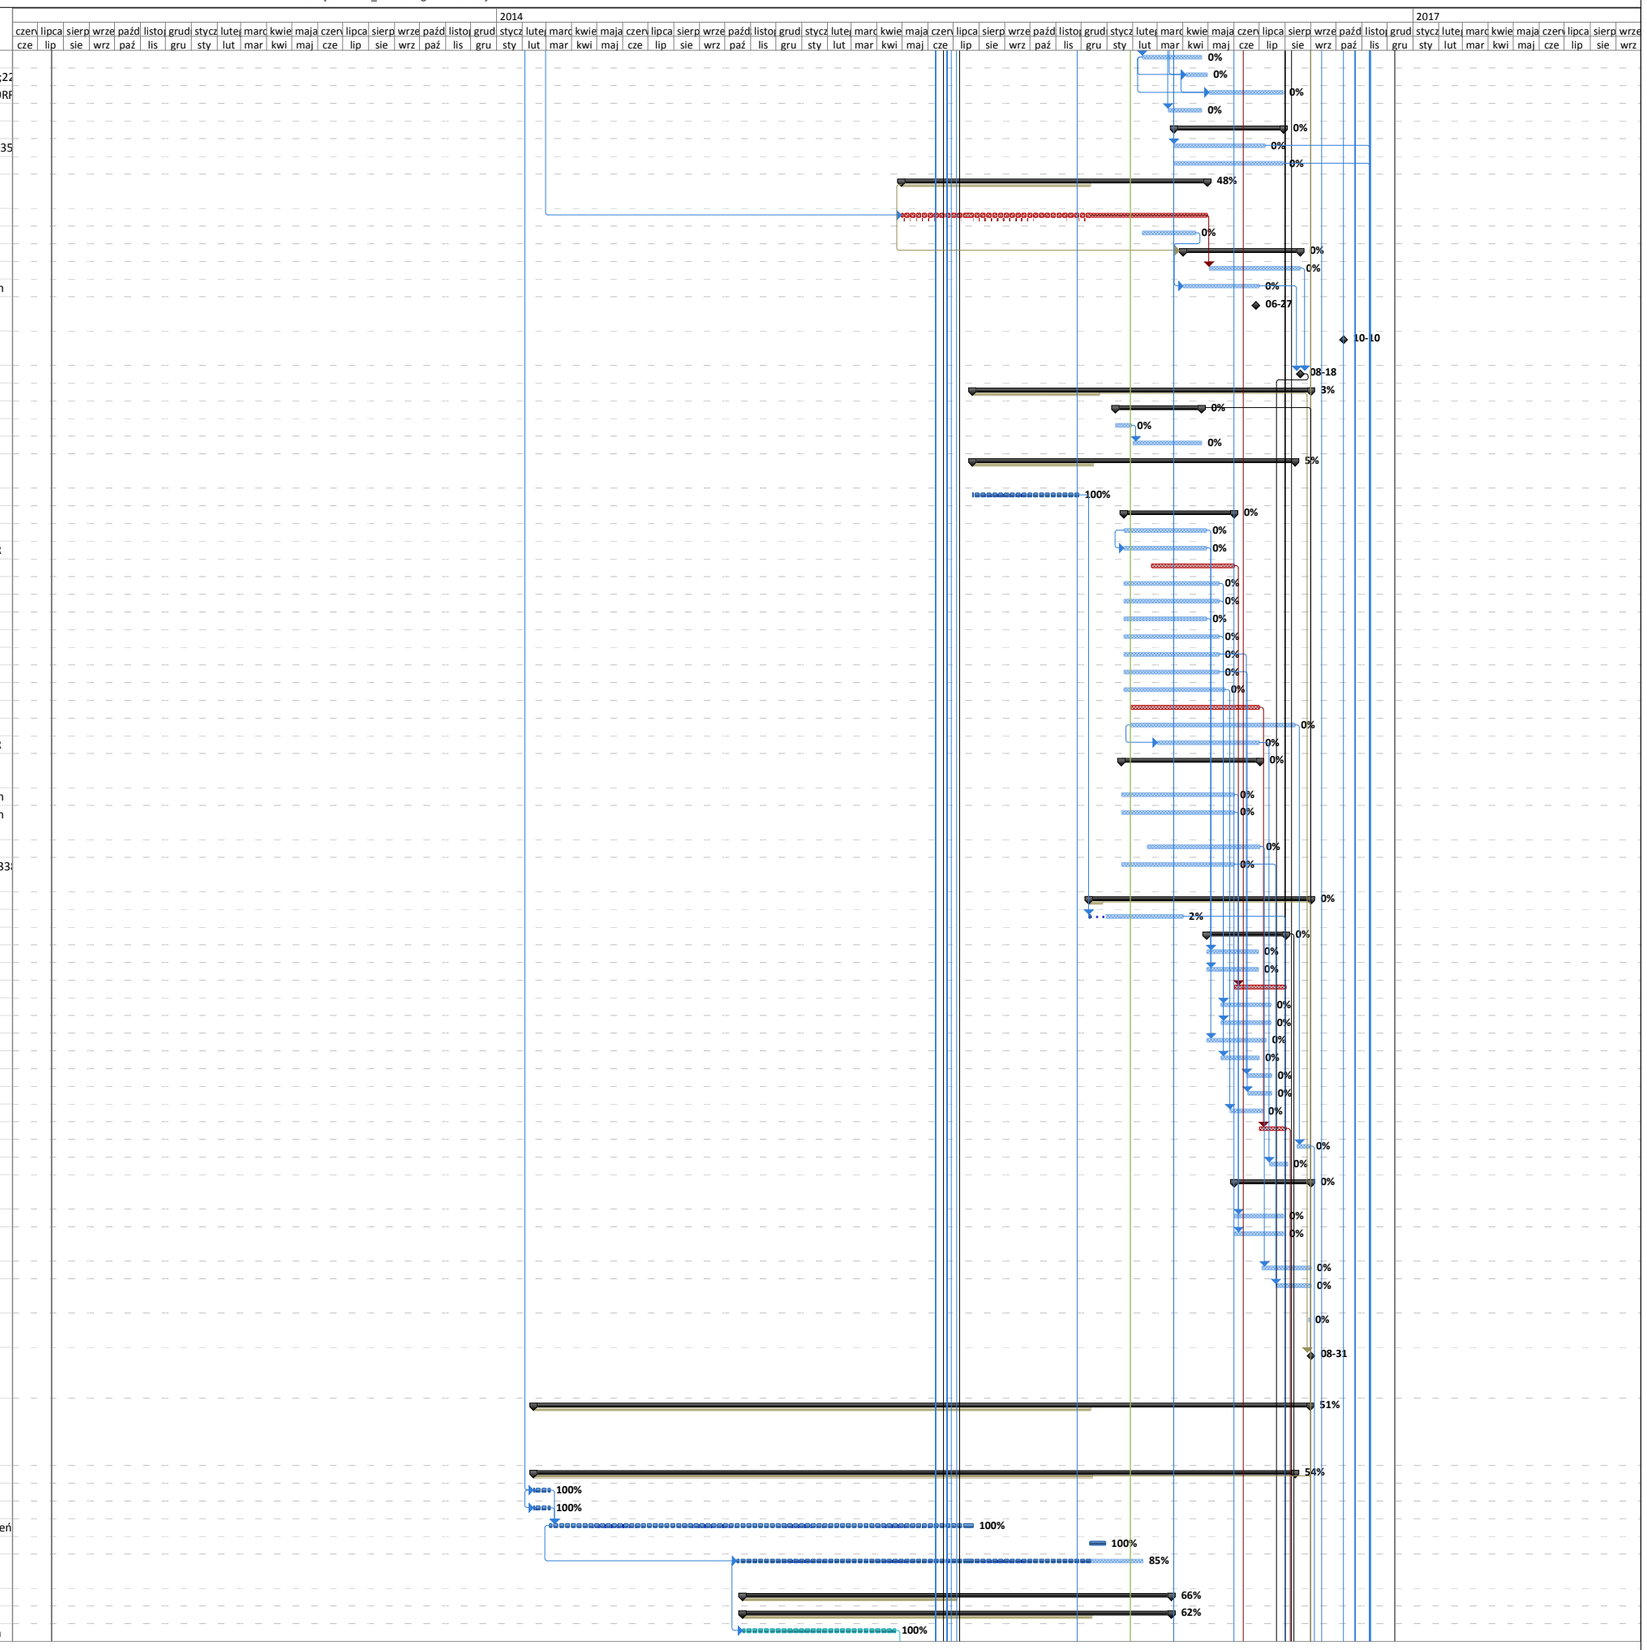

Id.	Pozycja Planu Płatności	Nr projektu	Nazwa zadania	Wykona %	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki
2352	10.1.5.1.2		betonowanie płyty A.21, A.22, A.23	100%	2 dn	2015-04-23	2015-04-24	2351
2353			Wykonanie instalacji podposadzkowej wraz z komorami A.20	0%	41 dn	2016-01-11	2016-02-26	
2354	10.1.5.1.3		chudy beton i zbrojenie płyty A.20	0%	34 dn	2016-01-29	2016-03-08	
2355	10.1.5.1.4		betonowanie płyty A.20 wraz z cokołami	0%	8 dn	2016-03-09	2016-03-17	2354
2356	10.1.5.2		betonowanie stóp pod urządzenia w hali IOS A.	100%	25 dn	2015-04-27	2015-05-29	2352
2357	10.1.5.3		betonowanie fundamentu pod komin	100%	4 dn	2015-05-11	2015-05-14	2352ZR+10 dn
2358	**10.1.6**		**Konstrukcja budynku A.21 i A.20**	**64%**	**264 dn**	**2015-07-27**	**2016-05-27**	
2359	10.1.6.1		wykonanie ścian - oś "3" (A.14, A.22, A.23)	55%	95 dn	2015-10-01	2016-01-29	2352
2360	10.1.6.2		wykonanie ścian - oś "16"	100%	32 dn	2015-10-01	2015-11-13	2359RR
2361	10.1.6.3		wykonanie ścian - oś "AE" (A.20)	0%	35 dn	2016-03-18	2016-04-27	2355
2362	10.1.6.4		wykonanie ścian - oś "ZA" (A.20)	0%	35 dn	2016-03-18	2016-04-27	2361RR
2363	10.1.6.5		konstrukcja stalowa hali oś "O"-"P" pomiędzy o	77%	130 dn	2015-07-27	2016-01-14	122
2364	10.1.6.6		konstrukcja stalowa hali oś "R"-"S" pomiędzy o	77%	130 dn	2015-07-27	2016-01-14	745;770;2363R
2365	10.1.6.7		konstrukcja stalowa hali oś "T"-"U" pomiędzy o	77%	130 dn	2015-07-27	2016-01-14	745;770;2364R
2366	10.1.6.8		konstrukcja stalowa hali oś "W"-"Z" pomiędzy (	77%	130 dn	2015-07-27	2016-01-14	745;770;2365R
2367			konstrukcja stalowa dachu A.21	77%	130 dn	2015-07-27	2016-01-14	745;770;2366R
2368	10.1.6.10		konstrukcja stalowa pomieszczenia A.20	0%	35 dn	2016-04-18	2016-05-27	2355ZR+21 dn
2369	10.1.6.11		konstrukcja stalowa dachu A.20	0%	35 dn	2016-04-18	2016-05-27	745;2368RR
2370	**10.1.7**		**Elewacje**	**0%**	**139 dn**	**2016-01-21**	**2016-06-30**	
2371	10.1.7.1		elewacja oś "16"	0%	139 dn	2016-01-21	2016-06-30	2363ZR+4 dn;7
2372	10.1.7.2		elewacja oś "3"	0%	49 dn	2016-02-01	2016-03-28	2365;773;748;2
2373	10.1.7.3		elewacja oś "ZA"	0%	118 dn	2016-02-15	2016-06-30	2366;773;748;2
2374	10.1.7.4		elewacja oś "AE" pomiędzy osiami "9"-"16"	0%	28 dn	2016-05-30	2016-06-30	773;748;2368;2
2375	10.1.8		pokrycie dachowe A.21	0%	54 dn	2016-01-15	2016-03-17	773;748;2423R
2376			pokrycie dachowe A.20	0%	28 dn	2016-05-30	2016-06-30	2369
2377	10.1.9		stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	0%	52 dn	2016-05-02	2016-06-30	2371RR-31 dn;2
2378	10.1.10		wykończenie	0%	59 dn	2016-06-06	2016-08-12	2377RR+25 dn;
2379	**10.1.11**		**Instalacje**	**22%**	**300 dn**	**2015-08-17**	**2016-07-29**	
2380	10.1.11.1		Instalacje wentylacji i ogrzewania	0%	95 dn	2016-04-11	2016-07-29	751;779
2381	10.1.11.2		Instalacje wod-kan	30%	284 dn	2015-08-17	2016-07-29	
2382	**10.2**		**Zamówienie, dostawa wraz z akceptacją dokumentacji przez Zamawiającego**	**63%**	**550 dn**	**2014-09-30**	**2016-06-30**	
2383	10.2.1		zespół redukowania tlenków azotu SNCR linii 1	71%	63 dn	2015-10-12	2015-12-31	1376ZR-36 dn;1
2384	10.2.2		zespół odpylania linii 1 (elektrofiltr)	41%	117 dn	2015-05-06	2016-02-29	1388ZR-30 dn;1
2385	10.2.3		zespoły absorpcji linii 1	47%	129 dn	2015-09-21	2016-02-29	1382ZR-75 dn
2386	10.2.4		zespół adsorpcji linii 1 (filtr workowy)	57%	156 dn	2015-08-11	2016-02-26	1385ZR-80 dn
2387	10.2.5		zespół wentylatora ciągu linii 1	100%	80 dn	2015-08-11	2015-11-30	1379RR;2386RF
2388	10.2.6		kanały spalin + kompensatory linii 1	44%	123 dn	2015-09-29	2016-02-29	1367ZR-68 dn
2389	10.2.7		zespół redukowania tlenków azotu SNCR linii 2	71%	63 dn	2015-10-12	2015-12-31	2383RR
2390	10.2.8		zespół odpylania linii 2 (elektrofiltr)	70%	228 dn	2015-05-06	2016-02-29	2384RR
2391	10.2.9		zespoły absorpcji linii 2	47%	129 dn	2015-09-21	2016-02-29	2385RR
2392	10.2.10		zespół adsorpcji linii 2 (filtr workowy)	57%	156 dn	2015-08-11	2016-02-26	2386RR
2393	10.2.11		zespół wentylatora ciągu linii 2	100%	80 dn	2015-08-11	2015-11-30	2387RR
2394	10.2.12		kanały spalin + kompensatory linii 2	44%	123 dn	2015-09-29	2016-02-29	2388RR
2395	10.2.13		komin wielociągowy + system CMES	68%	299 dn	2015-03-06	2016-04-01	1394
2396	10.2.14		silosy i zbiorniki na reagenty	33%	90 dn	2015-11-02	2016-02-18	1370ZR-45 dn;1
2397	10.2.15		konstrukcje nośne zespołów i urządzeń	60%	174 dn	2015-07-20	2016-02-29	1364ZR-83 dn
2398	10.2.16		Segment oczyszczania ścieków technologicznych	54%	381 dn	2015-02-27	2016-06-30	
2399	10.2.17		Wymiennik ciepła spaliny gorące-spaliny mokre	100%	12 dn	2015-05-14	2015-05-29	1409ZR+10 dn
2400	10.2.18		Stanowiska rozładunkowe reagentów + uzyskanie uzgodnienia w Transportowym Dozorze Technicznym dokumentacji urządzeń	45%	176 dn	2015-08-24	2016-03-31	1370ZR-90 dn;1397ZR-90 dn;1400ZR-90
2401	10.2.19		Pompy ciepła	82%	384 dn	2014-09-30	2016-02-29	
2402	10.2.20		Wymienniki kondensujące	100%	181 dn	2014-10-31	2015-07-10	
2403			Zamówienie, dostawa wraz z akceptacją dokumentacji przez Zamawiającego segmentu odprowadzania i oczyszczania spalin oraz systemy odzysku ciepła ze spalin oraz oczyszczania ścieków	0%	0 dn	2016-06-30	2016-06-30	2382
2404	**10.3**		**Montaż**	**36%**	**408 dn**	**2015-05-14**	**2016-08-30**	
2405	10.3.1		zespół redukowania tlenków azotu SNCR linii 1	0%	48 dn	2016-01-01	2016-02-25	2383
2406	10.3.2		zespół odpylania linii 1 (elektrofiltr)	51%	298 dn	2015-05-14	2016-05-27	2384ZR-168 dn
2407	10.3.3		zespoły absorpcji linii 1	47%	180 dn	2015-08-18	2016-03-31	2385ZR-120 dn
2408	10.3.4		zespół adsorpcji linii 1 (filtr workowy)	25%	157 dn	2015-10-20	2016-04-26	2386ZR-99 dn
2409	10.3.5		zespół wentylatora ciągu linii 1	65%	106 dn	2015-09-08	2016-01-22	2387ZR-80 dn
2410	10.3.6		kanały spalin + kompensatory linii 1	41%	144 dn	2015-09-22	2016-03-18	2388ZR-90 dn
2411	10.3.7		zespół redukowania tlenków azotu SNCR linii 2	0%	48 dn	2016-01-01	2016-02-25	2383
2412	10.3.8		zespół odpylania linii 2	51%	298 dn	2015-05-14	2016-05-27	2384ZR-168 dn
2413	10.3.9		zespoły absorpcji linii 2	48%	185 dn	2015-08-11	2016-03-31	2385ZR-120 dn
2414	10.3.10		zespół adsorpcji linii 2 (filtr workowy)	25%	157 dn	2015-10-20	2016-04-26	2386ZR-99 dn
2415	10.3.11		zespół wentylatora ciągu linii 2	65%	106 dn	2015-09-08	2016-01-22	2387ZR-80 dn
2416	10.3.12		kanały spalin + kompensatory linii 2	43%	148 dn	2015-09-16	2016-03-18	2388ZR-90 dn
2417	10.3.13		komin wielociągowy	37%	201 dn	2015-09-01	2016-05-06	2395ZR-131 dn
2418	10.3.14		silosy i zbiorniki na reagenty	19%	52 dn	2016-03-01	2016-04-30	2396ZR-67 dn
2419	10.3.15		konstrukcje nośne zespołów i urządzeń	48%	199 dn	2015-07-31	2016-04-08	2397RR+10 dn
2420	10.3.16		Segment oczyszczania ścieków technologicznych	0%	130 dn	2016-04-01	2016-08-30	2398ZR-79 dn;2355
2421	10.3.17		Wymienniki ciepła spaliny gorące-spaliny mokre	27%	83 dn	2015-11-12	2016-02-19	2399;2408RR+1
2422	10.3.18		Stanowiska rozładunkowe reagentów	0%	115 dn	2016-01-15	2016-05-27	2400RR
2423	10.3.19		Pompy ciepła	23%	191 dn	2015-10-14	2016-05-31	2401ZR-100 dn
2424	10.3.20		Wymienniki kondensujące wraz z instalacją cyrkulacyjną, pompami obiegowymi oraz wymiennikami płytowymi	22%	200 dn	2015-10-14	2016-06-10	2402ZR-100 dn;2413ZR-100 dn
2425			Zakończenie montażu segmentu odprowadzania i oczyszczania spalin oraz systemy odzysku ciepła ze spalin	0%	0 dn	2016-08-30	2016-08-30	2423;2404
2426	**11**		**Segment zagospodarowania odpadów procesowych z instalacji: A.18, A.19, A.24, E.1**	**44%**	**783 dn**	**2014-03-03**	**2016-08-30**	
2427	**11.1**		**Roboty budowlane**	**50%**	**756 dn**	**2014-03-03**	**2016-07-29**	
2428	**11.1.1**		**Fundamenty**	**100%**	**406 dn**	**2014-03-03**	**2015-06-18**	
2441	**11.1.2**		**Konstrukcja budynku**	**41%**	**345 dn**	**2015-06-25**	**2016-07-29**	

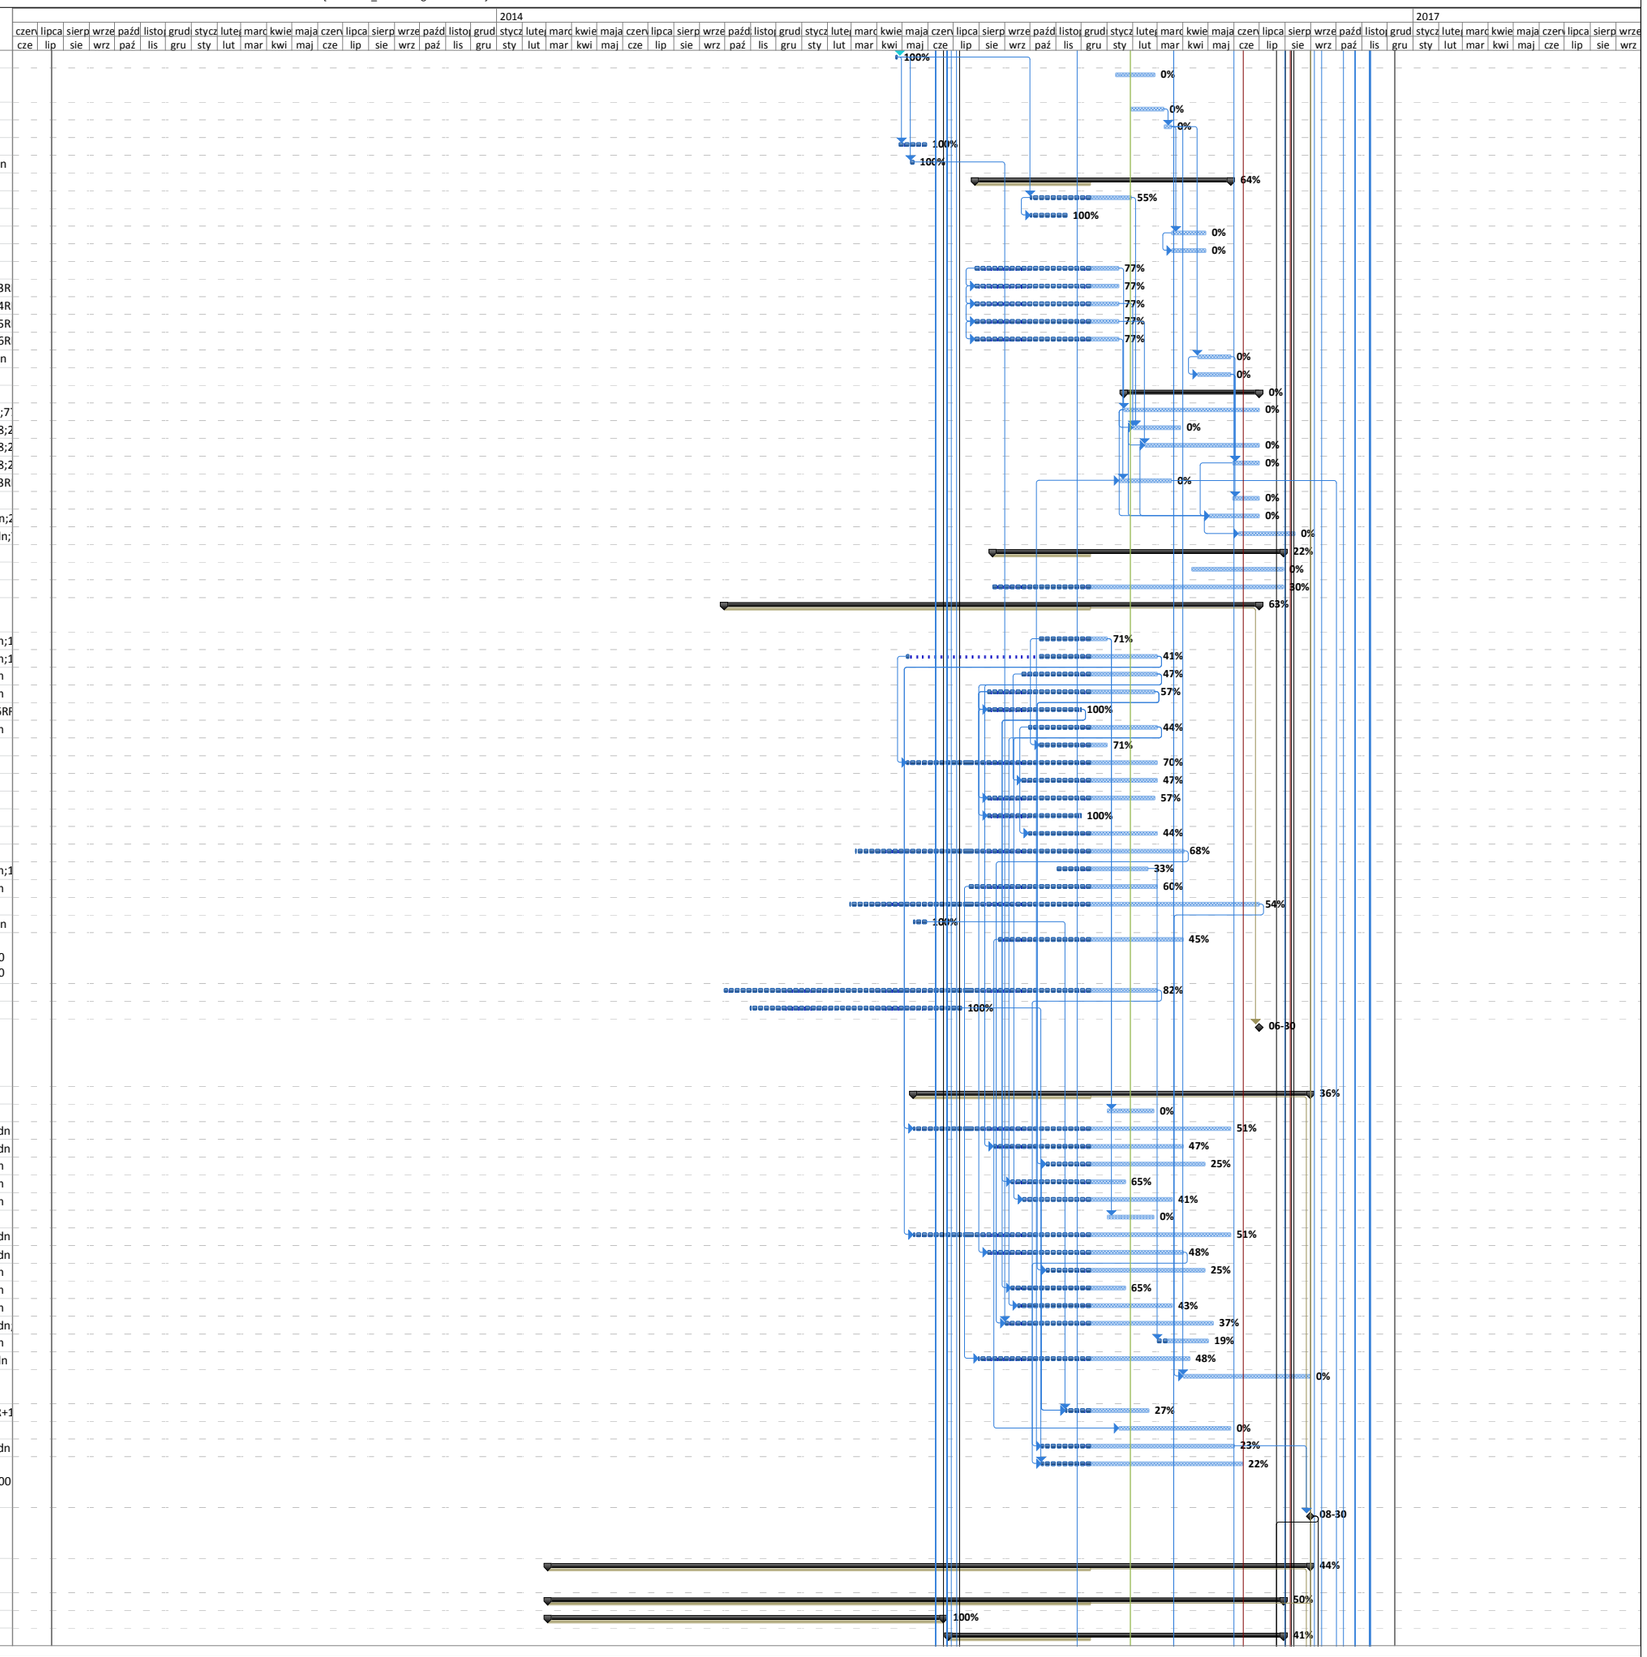

Id.	Pozycja Planu Płatności	Nr projektu	Nazwa zadania	Wykona %	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki
2442	**11.1.2.1**		**Budynek zagospodarowania odpadów poprocesowych z instalacji (A.19, A.24)**	**25%**	**340 dn**	**2015-07-01**	**2016-07-29**	
2443	11.1.2.1.1		wykonanie ścian w osi "3" pomiędzy osiami "Y'"-"AE" oraz w osi "AE" pomiędzy osiami	63%	188 dn	2015-07-01	2016-02-29	2434
2444	11.1.2.1.2		konstrukcja stalowa budynku	0%	26 dn	2016-03-01	2016-03-30	801;701;2434;2
2445	11.1.2.1.3		konstrukcja stalowa dachu	0%	26 dn	2016-03-01	2016-03-30	2444RR;801;70
2446	11.1.2.1.4		ściana wewnętrzna w osi "AB"	0%	25 dn	2016-03-02	2016-03-30	801;2444ZR-26
2447	11.1.2.1.5		elewacje	0%	36 dn	2016-03-31	2016-05-11	804;704;2444;2
2448	11.1.2.1.6		pokrycie dachu	0%	36 dn	2016-03-31	2016-05-11	2445;804;704
2449	11.1.2.1.7		stolarka okienna i drzwiowa	0%	36 dn	2016-03-31	2016-05-11	2447RR;804;70
2450	11.1.2.1.8		wykończenie	0%	104 dn	2016-03-31	2016-07-29	704;804;2448R
2451	**11.1.2.2**		**Budynek instalacji waloryzacji żużla (A.18)**	**54%**	**345 dn**	**2015-06-25**	**2016-07-29**	
2452	11.1.2.2.1		wykonanie ścian w osi "23" pomiędzy osiami "S"-"Z" oraz w osiach "S"-"Z"	100%	93 dn	2015-06-25	2015-10-30	2440
2453	11.1.2.2.2		konstrukcja stalowa budynku	79%	85 dn	2015-09-10	2015-12-31	723;2440ZR+21
2454	11.1.2.2.3		konstrukcja stalowa dachu	79%	85 dn	2015-09-10	2015-12-31	723;2453RR
2455	11.1.2.2.4		ściany wewnętrzne	100%	68 dn	2015-07-29	2015-10-30	723;801;2440
2456	11.1.2.2.5		elewacje	0%	49 dn	2016-01-20	2016-03-16	726;2454RR+95
2457	11.1.2.2.6		pokrycie dachowe	0%	49 dn	2016-01-20	2016-03-16	726;2456RR;24
2458	11.1.2.2.7		stolarka okienna i drzwiowa	0%	49 dn	2016-03-17	2016-05-12	726;2456
2459	11.1.2.2.8		wykończenie	0%	67 dn	2016-05-13	2016-07-29	726;2455;2458
2460	**11.1.3**		**Instalacje**	**26%**	**324 dn**	**2015-07-20**	**2016-07-29**	
2461	11.1.3.1		Instalacje wentylacji i ogrzewania	0%	101 dn	2016-04-04	2016-07-29	707;729;807;24
2462	11.1.3.2		Instalacje wod-kan	35%	304 dn	2015-07-20	2016-07-29	710
2463	**11.2**		**Zamówienie, dostawa wraz z akceptacją dokumentacji przez Zamawiającego**	**44%**	**455 dn**	**2015-02-09**	**2016-07-21**	
2464	11.2.1		Węzeł chemicznej stabilizacji i zestalania	0%	166 dn	2016-01-11	2016-07-21	111
2465	11.2.2		Węzeł waloryzacji żużli	65%	342 dn	2015-02-09	2016-04-29	111
2466	**11.3**		**Montaż**	**11%**	**273 dn**	**2015-10-19**	**2016-08-30**	
2467	11.3.1		Węzeł chemicznej stabilizacji i zestalania	0%	104 dn	2016-05-02	2016-08-30	2464ZR-71 dn;2
2468	11.3.2		Węzeł waloryzacji żużli	16%	237 dn	2015-10-19	2016-07-29	2465ZR-130 dn
2469			Zakończenie montażu segmentu zagospodarowania odpadów procesowych z instalacji	0%	0 dn	2016-08-30	2016-08-30	2467;2468;242
2470	**12**		**Segmenty procesowych zespołów pomocniczych instalacji: F.1, F.2, G.1, G.2, G.3, G.4, G.5, G.6, H.1, H.2, H.3, L.1, L.2, L.3, L.4, M.1, M.2, N, P.1-9**	**32%**	**603 dn**	**2014-09-30**	**2016-08-31**	
2471	**12.1**		**Roboty budowlane**	**41%**	**372 dn**	**2015-05-25**	**2016-07-29**	
2472	**12.1.1**		**Roboty ziemne**	**100%**	**111 dn**	**2015-05-25**	**2015-09-30**	**2151;2148**
2473	12.1.1.1		Roboty ziemne - wykopy	100%	94 dn	2015-05-25	2015-09-30	2151;2148ZR+5
2474	12.1.1.2		Roboty ziemne - wzmocnienie gruntu	100%	94 dn	2015-05-25	2015-09-30	2151;2148;286
2475	12.1.2		Fundamenty	100%	50 dn	2015-08-07	2015-10-15	171;218;225;23
2476	12.1.3		Prace konstrukcyjno-budowlane	41%	137 dn	2015-09-25	2016-03-14	2475RR+35 dn;
2477	**12.1.4**		**Instalacje**	**16%**	**300 dn**	**2015-08-17**	**2016-07-29**	
2478	12.1.4.1		Ujęcie wody powierzchniowej z Duńczycy	0%	158 dn	2016-01-28	2016-07-29	
2479	12.1.4.2		Instalacje wentylacji i ogrzewania	0%	101 dn	2016-04-04	2016-07-29	525;528;531;53
2480	12.1.4.3		Instalacje wod-kan	30%	284 dn	2015-08-17	2016-07-29	
2481			**F. Gospodarka oleju opałowego (F1, F2)**	**5%**	**120,75 dn**	**2016-01-20**	**2016-06-08**	
2482			roboty ziemne (wykop)	50%	12 dn	2016-01-20	2016-02-03	
2483			roboty żelbetowe konstrukcyjne	0%	29 dn	2016-02-09	2016-03-14	2482ZR+47 dn
2484			montaż kontenera	0%	5 dn	2016-03-23	2016-03-29	2483ZR+7 dn
2485			montaz zbiorników , pomostów	0%	20 dn	2016-03-23	2016-04-14	2483ZR+7 dn
2486			montaz instalacji technologicznych , wod-kan , el	0%	31 dn	2016-04-14	2016-05-20	2485
2487			prace wykończeniowe	0%	16 dn	2016-05-20	2016-06-08	2486
2488			**G.1 Stanowisko rozładunku węgla aktywnego BIG E**	**40%**	**224 dn**	**2015-09-01**	**2016-05-17**	
2489			konstrukcja żelbetowa	100%	72 dn	2015-09-01	2015-12-09	
2490			montaż urządzeń i instalacji	0%	53,25 dn	2016-03-01	2016-04-30	
2491			pokrycie dachu i elewacja	0%	28 dn	2016-03-14	2016-04-14	2489
2492			prace wykończeniowe	0%	28 dn	2016-04-15	2016-05-17	2491
2493			**G.2 , G4 Zbiornik NaOH, stanowisko rozładowcze**	**9%**	**131 dn**	**2016-01-18**	**2016-06-17**	
2494			instalacje podposadzkowa z komorą żelbetową	100%	15 dn	2016-01-18	2016-02-05	
2495			konstrukcja żelbetowa płyty dennej	0%	43 dn	2016-02-08	2016-03-28	2494
2496			konstrukcja stalowa zadaszenia	0%	12 dn	2016-03-31	2016-04-13	2495ZR+2 dn
2497			pokrycie dachu i elewacje ze ślusarką	0%	23 dn	2016-04-15	2016-05-11	2496ZR+1 dzień
2498			montaż instalacji u urządzeń technologicznych	0%	43 dn	2016-03-29	2016-05-17	2495
2499			prace wykończeniowe	0%	26 dn	2016-05-19	2016-06-17	2498ZR+1 dzień
2500			**G.3 Wiata gazów technicznych**	**17%**	**70 dn**	**2016-03-21**	**2016-06-09**	
2501			fundament zelbetowy	100%	7 dn	2016-03-21	2016-03-29	
2502			konstrukcja stalowa zadaszenia	20%	10 dn	2016-03-29	2016-04-08	2501ZR-2 dn
2503			pokrycie dachu i elewacje ze slusarką	0%	16 dn	2016-04-11	2016-04-28	2502
2504			prace wykończeniowe	0%	19 dn	2016-05-19	2016-06-09	2503ZR+14 dn
2505			**Obiekt G.5 - rozładunek cement i wapna**	**0%**	**36 dn**	**2016-03-01**	**2016-04-11**	
2506			Fundamenty/ Fundament żelbetowy	0%	12 dn	2016-03-01	2016-03-14	
2507			Konstrukcja	0%	12 dn	2016-03-15	2016-03-28	2506
2508			Wykończenie	0%	12 dn	2016-03-29	2016-04-11	2507
2509			**G.6 Zbiornik wapna**	**100%**	**52 dn**	**2015-09-01**	**2015-10-30**	
2510			fundament żelbetowy	100%	11 dn	2015-09-01	2015-09-15	
2511			montaz urządzeń i instalacji technologicznej	100%	33 dn	2015-09-16	2015-10-30	2510
2512			elewacja	100%	22 dn	2015-10-01	2015-10-30	
2513			**H. Gospodarka wody amoniakalnej (H1, H2 , H3)**	**1%**	**141 dn**	**2015-12-10**	**2016-05-20**	
2514			wzmocnienie gruntu (palowanie H3)	11%	18 dn	2015-12-10	2015-12-29	
2515			H1,H2 : gospodarka podposadzkowa wraz z ko	0%	43 dn	2015-12-30	2016-02-17	2514
2516			płyta fundamentowa żelbetowa	0%	49 dn	2016-01-04	2016-02-29	2514ZR+3 dn
2517			montaż urządzeń i instalacji technologicznych	0%	69 dn	2016-03-01	2016-05-19	2516
2518			konstrukcja stalowa zadaszenia i estakady	0%	14 dn	2016-03-02	2016-03-17	2516ZR+1 dzień
2519			zadaszenie i elewacja	0%	24 dn	2016-03-25	2016-04-21	2518ZR+5 dn
2520			prace wykończeniowe	0%	25 dn	2016-04-22	2016-05-20	2519
2521			**L. Pompownia wody technologicznej z ujęciem (L1 , L2)**	**13%**	**200 dn**	**2015-10-26**	**2016-06-13**	
2522			wykonanie ścian od poziomu -2,0 m	5%	44 dn	2015-10-26	2015-12-23	
2523			wykonanie stropu na poziomie -2,0 m	42%	24 dn	2015-12-23	2016-01-21	2522
2524			konstrukcja żelbetowa pozwyżej -2,0 m	0%	19 dn	2016-01-22	2016-02-12	2523

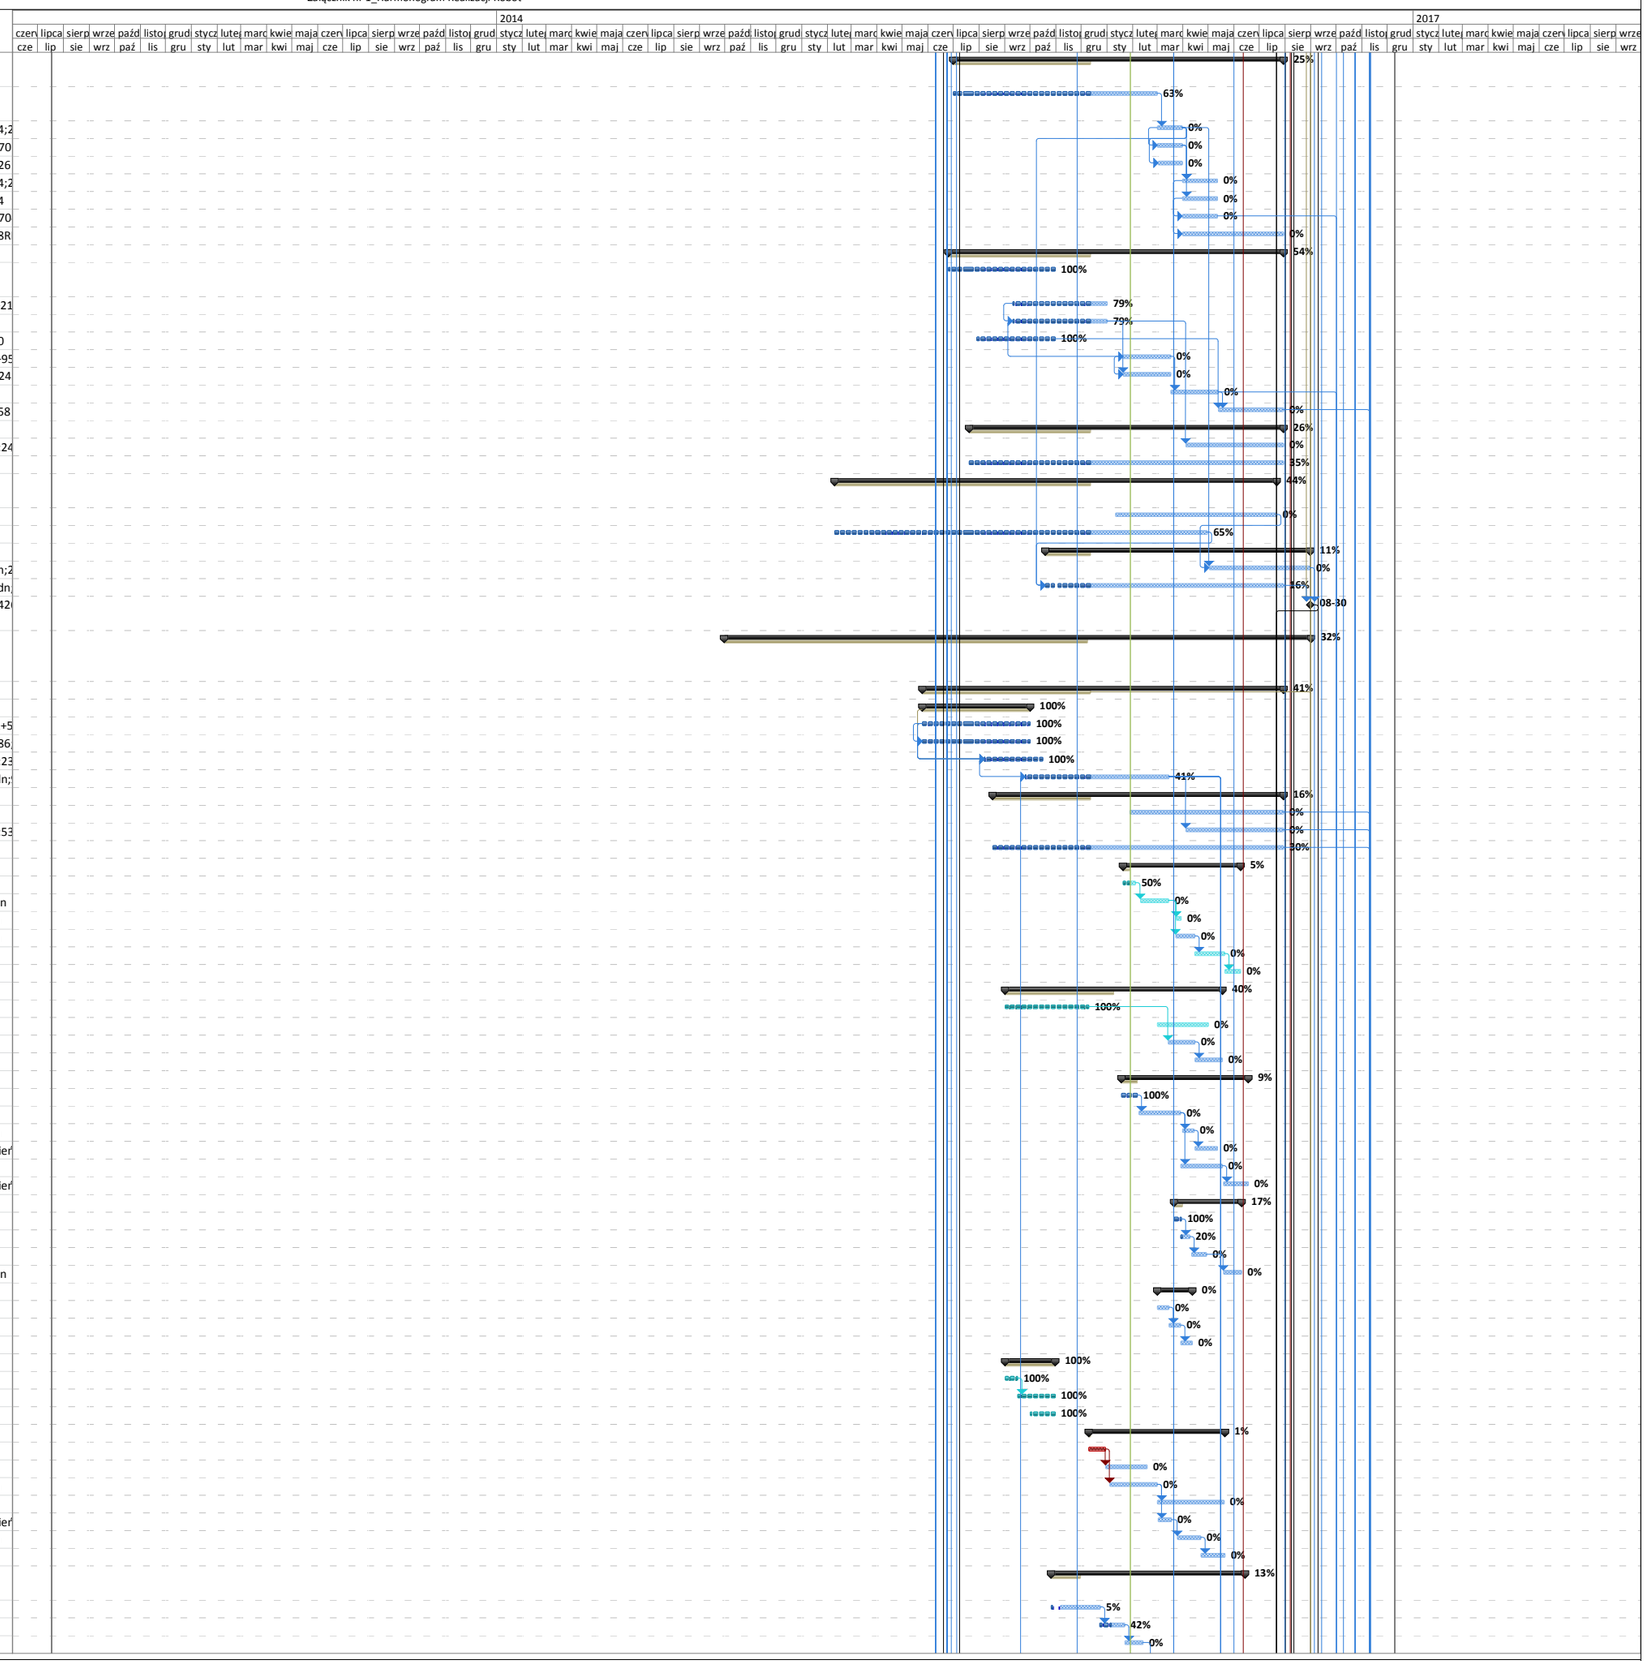

Id.	Pozycja Planu Płatności	Nr projektu	Nazwa zadania	Wykona %	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki
2525			konstrukcja stalowa zadaszenia	0%	5 dn	2016-02-22	2016-02-26	2524ZR+5 dn
2526			roboty murowe stanu surowego	0%	19 dn	2016-02-29	2016-03-21	2525
2527			pokrycie dachu i elewacja	0%	40 dn	2016-02-29	2016-04-14	2525
2528			montaż instalacji wewnętrznych (wod-kan,elektrycznych)	0%	21 dn	2016-03-21	2016-04-13	2526ZR-1 dzień
2529			prace wykończeniowe wewnętrzne	0%	52 dn	2016-04-14	2016-06-13	2528
2530			prace wykończeniowe zewnętrzne	0%	52 dn	2016-04-14	2016-06-13	2528
2531			roboty żelbetowe związane z ujęciem	36%	98 dn	2015-10-26	2016-02-22	
2532			**Obiekt L.3 i L.4**	**0%**	**219 dn**	**2015-12-21**	**2016-08-31**	
2533			Kolumny wzmacniające	0%	23 dn	2015-12-21	2016-01-15	
2534			Roboty ziemne	0%	14 dn	2016-01-25	2016-02-09	2533ZR+5 dn
2535			Instalacja podposadzkowa	0%	24 dn	2016-02-10	2016-03-08	2534
2536			Fundamenty	0%	21 dn	2016-02-26	2016-03-21	2535ZR-10 dn
2537			Konstrukcja	0%	14 dn	2016-03-22	2016-04-06	2536
2538			Wykończenie	0%	73 dn	2016-04-07	2016-06-30	2537
2539			Montaż technologii	0%	103 dn	2016-05-04	2016-08-31	
2540			**M. Pompownia p.poż ze zbiornikiem (M1, M2)**	**19%**	**278 dn**	**2015-09-28**	**2016-08-15**	
2541			fundament żelbetowy zbiornika i pompowni	56%	98 dn	2015-09-28	2016-01-29	
2542			montaż konstrukcji zbiornika	0%	79 dn	2016-04-15	2016-07-15	
2543			montaż izolacji zbiornika	0%	25 dn	2016-07-18	2016-08-15	2542
2544			konstrukcja stalowa pompowni	0%	25 dn	2016-03-14	2016-04-11	
2545			pokrycie dachu pompowni i elewacje ze ślusark	0%	27 dn	2016-04-12	2016-05-12	2544
2546			prace wykończeniowe	0%	42 dn	2016-05-13	2016-06-30	2545
2547			**N. Kotłownia dodatkowa**	**25%**	**251 dn**	**2015-09-22**	**2016-07-08**	
2548			wykonanie wzmocnienia gruntu (palowanie - k	100%	2 dn	2015-10-26	2015-10-27	
2549			fundament komina	0%	14 dn	2016-01-11	2016-01-26	
2550			montaż konstrukcji stalowej kotłowni	66%	53 dn	2015-10-26	2015-12-31	
2551			pokrycie dachu i elewacje ze ślusarką	0%	25 dn	2016-02-01	2016-02-29	2550ZR+21 dn
2552			dostawa i montaż instalacji technologicznej	29%	207 dn	2015-09-22	2016-05-31	2571ZR-29 dn
2553			prace wykończeniowe	0%	83 dn	2016-04-04	2016-07-08	2551ZR+24 dn
2554			**P. Zbiorniki ścieków i inne (P1, P2, P4, P5)**	**33%**	**233 dn**	**2015-08-05**	**2016-04-30**	
2555			roboty ziemne	57%	162 dn	2015-08-05	2016-02-29	
2556			roboty żelbetowe (płyta denna)	49%	189 dn	2015-08-05	2016-03-31	2555RR
2557			roboty żelbetowe ściany , stropy	0%	220 dn	2015-08-20	2016-04-30	
2558			**P.3 Kanał zrzutu ścieków pochłodniczych**	**70%**	**182 dn**	**2015-08-03**	**2016-02-29**	
2559			roboty ziemne	100%	31 dn	2015-08-03	2015-09-14	
2560			roboty żelbetowe wraz z pracami przeglębieniow	100%	8 dn	2015-09-07	2015-09-16	
2561			ułożenie gabionów	100%	56 dn	2015-09-14	2015-11-30	
2562			Wykonanie wylotu kanału	49%	134 dn	2015-09-14	2016-02-29	
2563			**P.7 Myjnia kół i podwozi samochodowych**	**100%**	**11 dn**	**2015-11-09**	**2015-11-20**	
2564			wykonanie fundamentu żelbetowego	100%	10 dn	2015-11-09	2015-11-20	
2565	**12.2**		**Zamówienie, dostawa wraz z akceptacją dokumentacji przez Zamawiającego**	**59%**	**550 dn**	**2014-09-30**	**2016-06-30**	
2566	12.2.1		Stacja przygotowania zdemineralizowanej wody zasilającej i procesowej	0%	157 dn	2015-12-31	2016-06-30	
2567	12.2.2		Segment magazynowania i zasilania ZTUO olejem	64%	186 dn	2015-07-01	2016-02-26	
2568	12.2.3		Instalacja sprężonego powietrza	71%	418 dn	2014-10-24	2016-04-29	
2569	12.2.4		Pompownia wody technologicznej	34%	100 dn	2016-01-28	2016-05-31	947ZR+30 dn
2570	12.2.5		Pompownia p.poż ze zbiornikiem	0%	80 dn	2016-01-28	2016-04-29	969ZR-35 dn;25
2571	12.2.6		Kotłownia dodatkowa	100%	285 dn	2014-09-30	2015-10-30	
2572	12.2.7		Zabezpieczenia ppoż.	0%	26 dn	2016-05-02	2016-05-31	
2573	**12.3**		**Montaż**	**9%**	**296 dn**	**2015-09-22**	**2016-08-30**	
2574	12.3.1		Stacja przygotowania zdemineralizowanej wody zasilającej i procesowej	0%	104 dn	2016-05-02	2016-08-30	2566ZR-53 dn
2575	12.3.2		Segment magazynowania i zasilania ZTUO olejem	0%	118 dn	2016-03-15	2016-07-29	2567
2576	12.3.3		Instalacja sprężonego powietrza - od sprężarkowni do zbiorników wyrównawczych	14%	142 dn	2015-11-16	2016-04-30	2568ZR-121 dn;2476RR+20
2577			Instalacja sprężonego powietrza - pętle sprężonego powietrza wraz z podejściami do urzadzeń i armatury	0%	108 dn	2016-04-14	2016-08-17	2576ZR-15 dn
2578	12.3.4		Pompownia wody technologicznej	0%	77 dn	2016-05-02	2016-07-29	2569ZR-26 dn
2579	12.3.5		Pompownia p.poż ze zbiornikiem	0%	77 dn	2016-05-02	2016-07-29	2570
2580	12.3.6		Kotłownia dodatkowa	29%	207 dn	2015-09-22	2016-05-31	2571ZR-29 dn
2581	12.3.7		Zabezpieczenia ppoż.	0%	52 dn	2016-05-02	2016-06-30	2572ZR-26 dn
2582			Zakończenie montażu segmentu procesowych zespołów pomocniczych instalacji	0%	0 dn	2016-08-30	2016-08-30	2574;2575;2576
2583	**13**		**Część poza technologiczna-wyposażenie oraz garaż O**	**43%**	**660 dn**	**2014-07-25**	**2016-08-31**	
2584	13.1		Garaż - roboty ziemne i płyta fundamentowa	98%	368 dn	2014-07-25	2015-12-18	236
2585			**O. Garaż**	**0%**	**138 dn**	**2015-10-25**	**2016-03-31**	
2586			montaż konstrukcji stalowej	0%	19 dn	2016-03-14	2016-04-04	
2587			pokrycie dachu i elewacja ze ślusarką	0%	30 dn	2016-04-05	2016-05-09	2586
2588			pozostałe roboty murowe	0%	19 dn	2016-04-05	2016-04-26	2586
2589			prace wykończeniowe (tynk, posadzki)	0%	27 dn	2016-05-10	2016-06-09	2587
2590	13.2		Wyposażenie pomieszczenia technicznego	0%	93 dn	2016-05-16	2016-08-31	2476
2591	13.3		Wyposażenie laboratorium	0%	93 dn	2016-05-16	2016-08-31	2476
2592	13.4		Wyposażenie warsztatu	0%	93 dn	2016-05-16	2016-08-31	2476
2593	13.5		Pozostałe wyposażenie	0%	93 dn	2016-05-16	2016-08-31	2476
2594			Zakończenie wyposażenia poza technologicznego	0%	0 dn	2016-08-31	2016-08-31	2583;2584;2596
2595	**14**		**Sieci zewnętrzne**	**49%**	**383 dn**	**2015-04-13**	**2016-06-30**	
2596	14.1		Sieć wodociągowa i ppoż.	55%	321 dn	2015-04-13	2016-06-30	1738ZR+40 dn;
2597	14.2		Sieci kanalizacyjne	55%	321 dn	2015-04-13	2016-06-30	1735;1738;2596
2598	14.3		Przyłącze do Spółki Wodnej „Międzyodrze”	0%	75 dn	2016-03-14	2016-06-08	1311
2599			Zakończenie montażu sieci zewnętrznych	0%	0 dn	2016-06-30	2016-06-30	2595;2596;2597
2600	**15**		**Zagospodarowanie terenu: D, E.2, R,**	**68%**	**826 dn**	**2014-01-13**	**2016-08-31**	
2601	15.1		Chodniki	0%	45 dn	2016-07-11	2016-08-31	1760;2598RR+2
2602	15.2		Nasypy przeciążające - wykonanie	100%	373 dn	2014-03-28	2015-08-31	2436RR-78 dn
2603	15.3		Konsolidacja gruntu	100%	420 dn	2014-03-28	2015-11-04	2602RR
2604			Wzmocnienie podłoża (nasypy , konsolidacja)	100%	430 dn	2014-03-28	2015-11-18	
2605			Makroniwelacja (nasypy , profilowanie)	81%	553 dn	2014-03-28	2016-04-13	
2606	**15.4**		**Drogi dojazdowe, place manewrowe, parkingi**	**28%**	**798 dn**	**2014-01-13**	**2016-07-29**	
2607	15.4.1		Wzmocnienie podłoża	100%	51 dn	2014-01-13	2014-04-04	267

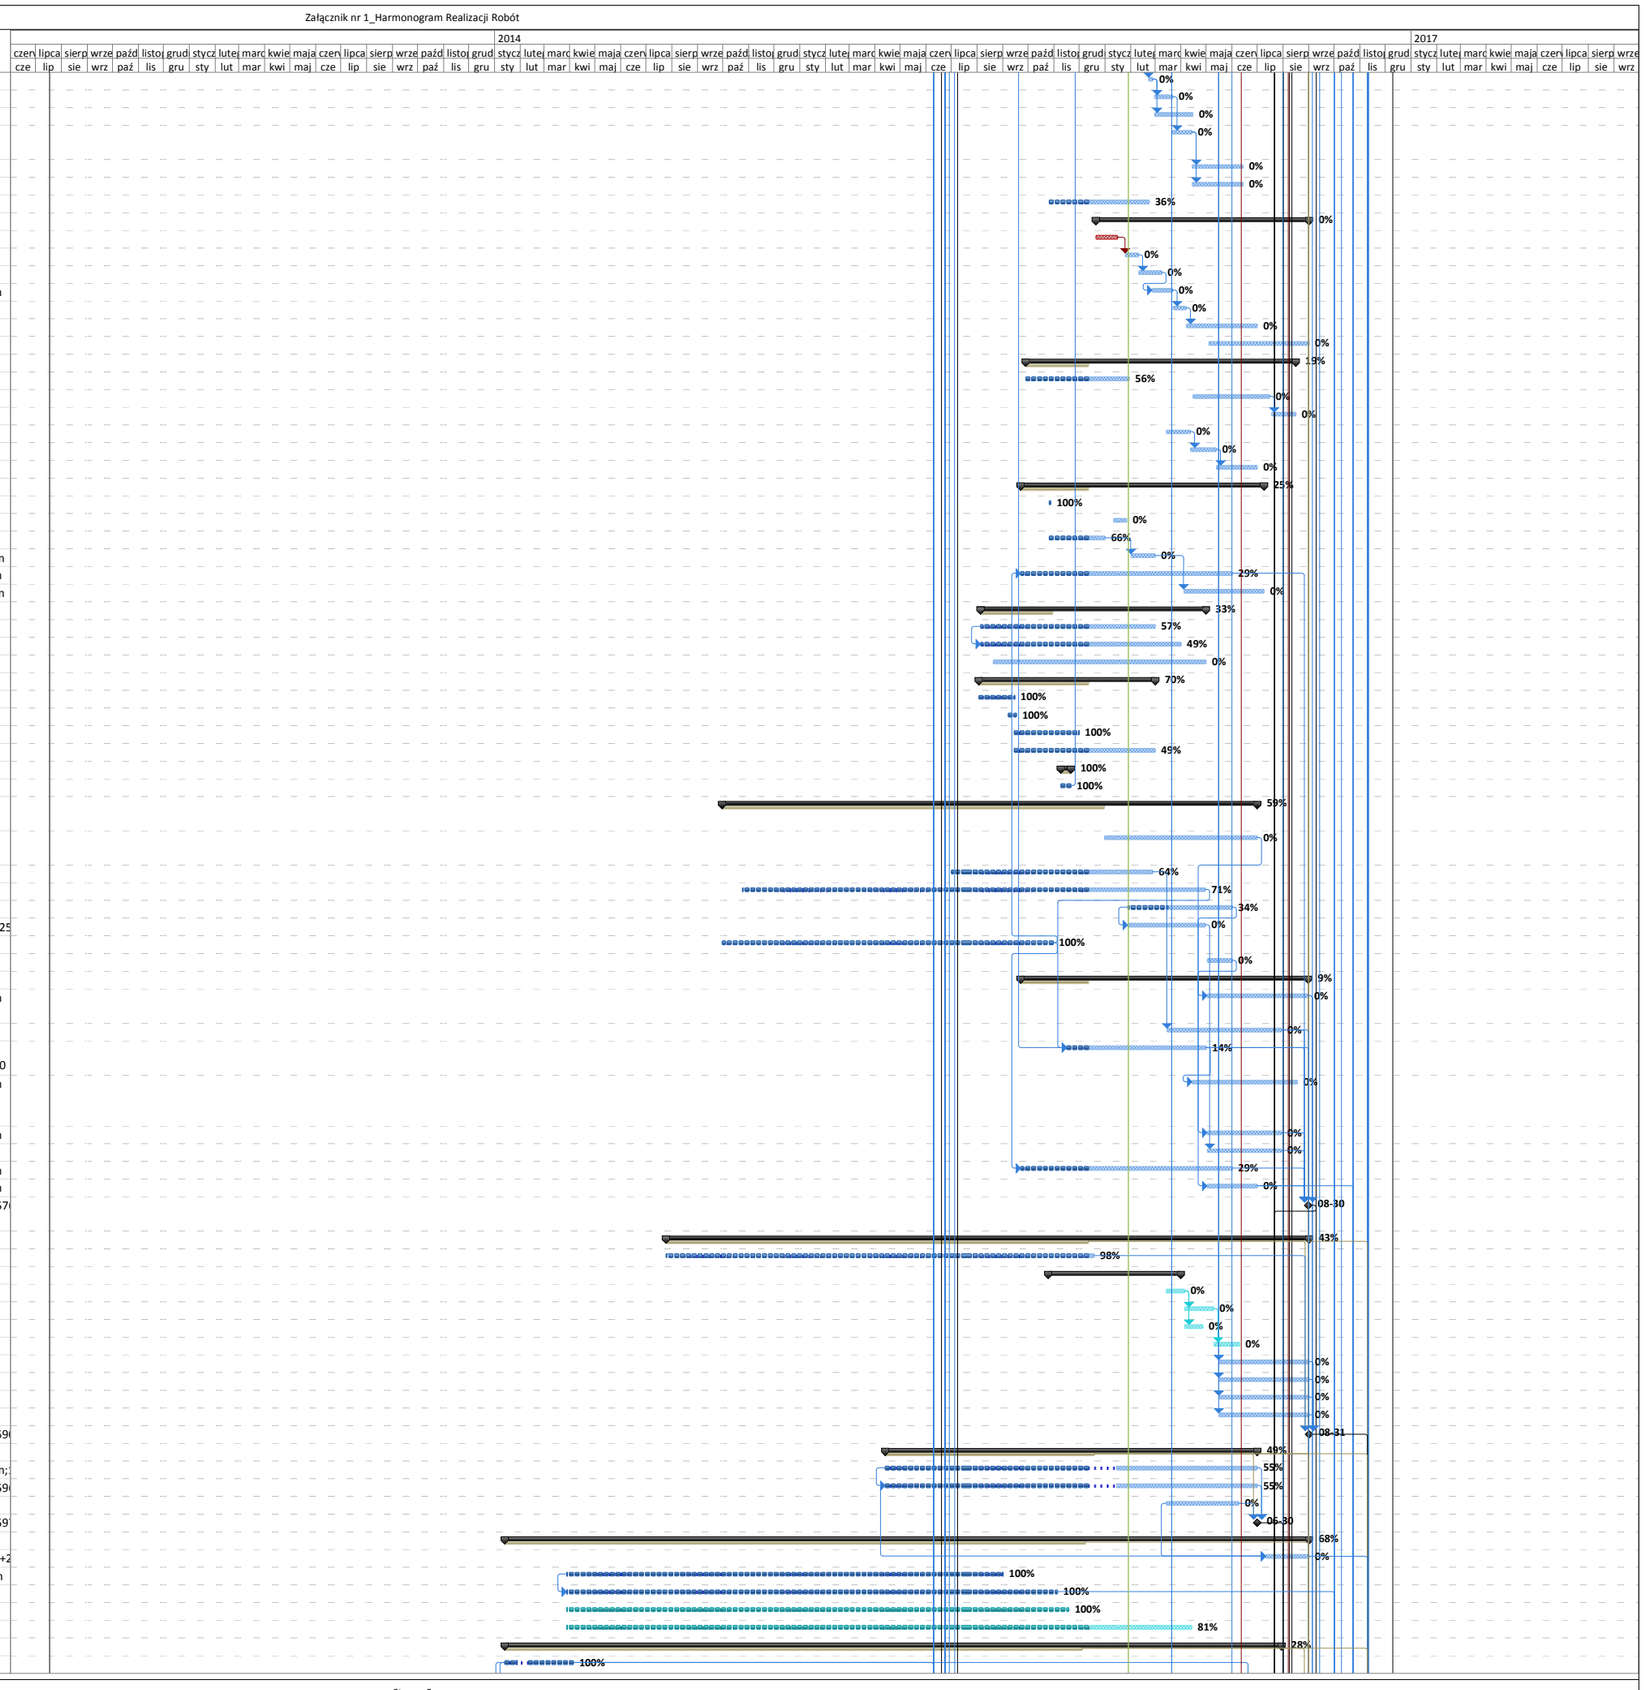

Id.	Pozycja Planu Płatności	Nr projektu	Nazwa zadania	Wykona %	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki
2608	15.4.2		droga od strony N do parkingu (od D do parkingu)	70%	191 dn	2015-06-10	2016-02-29	2607
2609	15.4.3		parking	23%	239 dn	2015-09-28	2016-07-12	1760;2608RR
2610	15.4.4		droga od wjazdu do wag (od A do C)	0%	74 dn	2016-04-18	2016-07-12	1760;2608RR+2
2611	15.4.5		droga od wag do placu składowania (od C do park	100%	63 dn	2015-09-03	2015-11-30	1760;2608RR
2612	15.4.6		plac przed halą wyładunkową	0%	67 dn	2016-03-15	2016-05-31	1760;2608RR
2613	15.4.7		droga od budynku elektr do obróbki żużla (od D do E)	0%	35 dn	2016-06-20	2016-07-29	1760;2608RR
2614	15.4.8		droga od obróbki żużla do pompowni (od E do G1)	0%	151 dn	2016-01-07	2016-06-30	1760;2608RR
2615	15.4.9		droga za składowaniem żużla (od F,G do F1)	22%	89 dn	2015-11-16	2016-02-29	1760;2608RR
2616	15.4.10		droga od składowania żużla do hali kotłów (od F1 do H)	0%	158 dn	2015-11-16	2016-05-16	1760;2608RR;2
2617	15.4.11		droga od hali kotłów do parkingu (od H do parkingu)	0%	40 dn	2016-02-15	2016-03-31	1760;2608RR;2
2618	15.5		Elementy małej architektury	0%	41 dn	2016-06-20	2016-08-05	1763;2607;262
2619	**15.6**		**Zieleń**	**54%**	**809 dn**	**2014-01-31**	**2016-08-30**	
2620	15.6.1		makroniwelacja	100%	21 dn	2014-01-31	2014-02-28	2607RR+14 dn
2621	15.6.2		uformowanie skarpy	49%	288 dn	2015-06-01	2016-05-30	
2622	15.6.3		nasadzenia	56%	510 dn	2014-01-31	2016-08-30	2621RR
2623	**15.7**		**Magazyn sezonowania żużla i magazyn po zestalaniu**	**89%**	**758 dn**	**2014-01-13**	**2016-06-13**	
2624			**Roboty ziemne i żelbetowe**	**96%**	**758 dn**	**2014-01-13**	**2016-06-13**	
2625	15.7.1		Wykop/nasyp	100%	78 dn	2014-01-13	2014-06-30	2607RR
2626	15.7.2		Platforma robocza	100%	53 dn	2014-04-29	2014-07-10	2625RR+30 dn
2627	15.7.3		Palowanie etap 3	100%	28 dn	2014-07-11	2014-08-19	2626;289
2628	15.7.4		zbrojenie płyty	100%	136 dn	2015-01-13	2015-07-20	2627ZR-50 dn;1
2629	15.7.5		płyta fundamentowa	100%	174 dn	2015-02-11	2015-10-09	2628RR+7 dn
2630	15.7.6		posadzka	0%	25 dn	2016-05-16	2016-06-13	2629;2635
2631	15.7.11		betonowanie ścian strona N	100%	53 dn	2015-08-12	2015-10-23	
2632	15.7.12		betonowanie ścian strona S	100%	7 dn	2015-08-27	2015-09-04	
2633	15.7.13		betonowanie ścian strona E	100%	14 dn	2015-08-05	2015-08-24	
2634	15.7.14		betonowanie ścian strona W	100%	51 dn	2015-08-14	2015-10-23	
2635	15.7.15		konstrukcja hali (konstrukcja stalowa hali) wraz z	100%	71 dn	2015-08-24	2015-11-30	
2636	15.7.17		pokrycie dachu	0%	35 dn	2016-02-01	2016-03-11	
2637	15.7.18		wykończenie	0%	26 dn	2016-03-14	2016-04-12	2636
2638	**15.8**		**Magazyn Balotów**	**100%**	**553 dn**	**2014-02-14**	**2015-11-20**	
2639	15.8.1		wykop (wzmocnienie gruntu z wykopami/ nasypa	100%	1 dzień	2014-02-14	2014-02-14	2430RR
2640	15.8.2		zbrojenie płyty	100%	25 dn	2015-10-01	2015-11-04	2639;260;263;2
2641	15.8.3		płyta	100%	19 dn	2015-10-27	2015-11-20	2640RR
2642			Zakończenie prac zagospodarownia terenu	0%	0 dn	2016-08-31	2016-08-31	2621ZR-1 dzień
2643	**16**		**Środki transportu i sprzęt ruchomy**	**0%**	**119 dn**	**2016-03-14**	**2016-07-29**	
2644	16.1		Sprzęt ruchomy	0%	119 dn	2016-03-14	2016-07-29	
2645	16.2		Środki transportu	0%	119 dn	2016-03-14	2016-07-29	2644RR
2646			Przekazanie środków transportu i środków majątku trwałego	0%	0 dn	2016-07-29	2016-07-29	2643;2644;264
2647	**17**		**System elektryczny**	**0%**	**171 dn**	**2016-02-15**	**2016-08-31**	
2648	**17.1**		**Wykonanie systemu elektrycznego**	**0%**	**171 dn**	**2016-02-15**	**2016-08-31**	
2649	**17.1.1**		**Wykonanie systemu**	**0%**	**171 dn**	**2016-02-15**	**2016-08-31**	
2650	**17.1.1.1**		**Dostawa**	**0%**	**143 dn**	**2016-02-15**	**2016-07-29**	
2651	17.1.1.1.1		Dostawa kabli	0%	131 dn	2016-02-29	2016-07-29	1525ZR+30 dn
2652	**17.1.1.1.2**		**Konstrukcje kablowe bez pokryw**	**0%**	**114 dn**	**2016-02-19**	**2016-06-30**	
2653	17.1.1.1.2.1		Konstrukcje kablowe: A.1, A.8-A.20, B, D-P	0%	114 dn	2016-02-19	2016-06-30	1528ZR+16 dn
2654	17.1.1.1.2.2		Konstrukcje kablowe: A.5, A.21-A.24, A.7, A.2, A.3, A.4, A.6, C	0%	114 dn	2016-02-19	2016-06-30	1528ZR+16 dn
2655	**17.1.1.1.3**		**Oświetlenie**	**0%**	**141 dn**	**2016-02-15**	**2016-07-27**	
2656	17.1.1.1.3.1		Oświetlenie w A.1-A.11, A.13-A.21, A.23, A.24, C.1-C.3, F.2, G.2, K.1, L.1, M.1, N, O	0%	102 dn	2016-03-31	2016-07-27	328;350;381;40
2657	17.1.1.1.3.2		Dostawa oświetlenia zewnętrznego R1-R9	0%	22 dn	2016-02-15	2016-03-10	1744ZR+72 dn
2658	**17.1.1.1.4**		**Dostawa instalacji niskoprądowych**	**0%**	**63 dn**	**2016-03-21**	**2016-06-01**	
2659	17.1.1.1.4.1		CCTV	0%	38 dn	2016-03-21	2016-05-03	1712ZR+133 dn
2660	17.1.1.1.4.2		SAP	0%	38 dn	2016-03-21	2016-05-03	1722ZR+56 dn
2661	17.1.1.1.4.3		Okablowanie teletechniczne	0%	63 dn	2016-03-21	2016-06-01	1712ZR+133 dn
2662	17.1.1.1.4.4		Detekcja gazów	0%	38 dn	2016-03-21	2016-05-03	1715ZR+56 dn
2663	**17.1.1.2**		**Montaż**	**0%**	**158 dn**	**2016-03-01**	**2016-08-31**	
2664	**17.1.1.2.1**		**Układanie kabli**	**0%**	**130 dn**	**2016-04-01**	**2016-08-30**	
2665	17.1.1.2.1.1		Układanie kabli część ogólna - A.1-A.11, A.13-A.21, A.23, A.24, C.1-C.3, F.2, G.2,	0%	130 dn	2016-04-01	2016-08-30	2651ZR-107 dn;2652ZR-140
2666	**17.1.1.2.1.3**		**Konstrukcje kablowe bez pokryw**	**0%**	**130 dn**	**2016-03-01**	**2016-07-29**	**2652ZR-140 dn**
2667	17.1.1.2.1.3.1		Konstrukcje kablowe: A.1, A.8-A.20, B, D-P	0%	130 dn	2016-03-01	2016-07-29	
2668	17.1.1.2.1.3.2		Konstrukcje kablowe: A.5, A.21-A.24, A.7,	0%	130 dn	2016-03-01	2016-07-29	2667RR
2669	**17.1.1.2.1.4**		**Oświetlenie A.1-A.11, A.13-A.21, A.23, A.24, C.1-C.3, F.2, G.2, K.1, L.1, M.1, N, O, R.1-R.9**	**0%**	**152 dn**	**2016-03-07**	**2016-08-30**	
2670	17.1.1.2.1.4.1		Oświetlenie A.1-A.11, A.13-A.21, A.23, A.24, C.1-C.3, F.2, G.2, K.1, L.1, M.1, N, O	0%	126 dn	2016-04-06	2016-08-30	2656ZR-99 dn
2671	17.1.1.2.1.4.2		Oświetlenie R.1-R.9	0%	39 dn	2016-03-07	2016-04-20	2657RR+15 dn
2672	**17.1.1.2.1.5**		**Montaż instalacji niskoprądowych**	**0%**	**131 dn**	**2016-04-01**	**2016-08-31**	
2673	17.1.1.2.1.5.1		CCTV	0%	131 dn	2016-04-01	2016-08-31	2659ZR-29 dn
2674	17.1.1.2.1.5.2		SAP	0%	131 dn	2016-04-01	2016-08-31	2660ZR-29 dn
2675	17.1.1.2.1.5.3		Okablowanie teletechniczne	0%	105 dn	2016-05-02	2016-08-31	2661ZR-27 dn
2676	17.1.1.2.1.5.4		Detekcja gazów	0%	131 dn	2016-04-01	2016-08-31	2662ZR-28 dn
2677			**Montaż instalacji SN**	**0%**	**89 dn**	**2016-04-18**	**2016-07-30**	
2678			Wykonanie linii kablowej zasilania rezerwowego SN - PKP Energetyka	0%	38 dn	2016-04-18	2016-05-31	2651ZR-94 dn
2679			Wykonanie podłączenia do przyłącza zasilania rezerwowego SN - PKP Energetyka	0%	5 dn	2016-06-01	2016-06-06	2678
2680			Wykonanie linii kablowej zasilania podstawowego SN (Enea Operator) do granicy działki - zakres Wykonawcy	0%	26 dn	2016-05-02	2016-05-31	2651ZR-80 dn

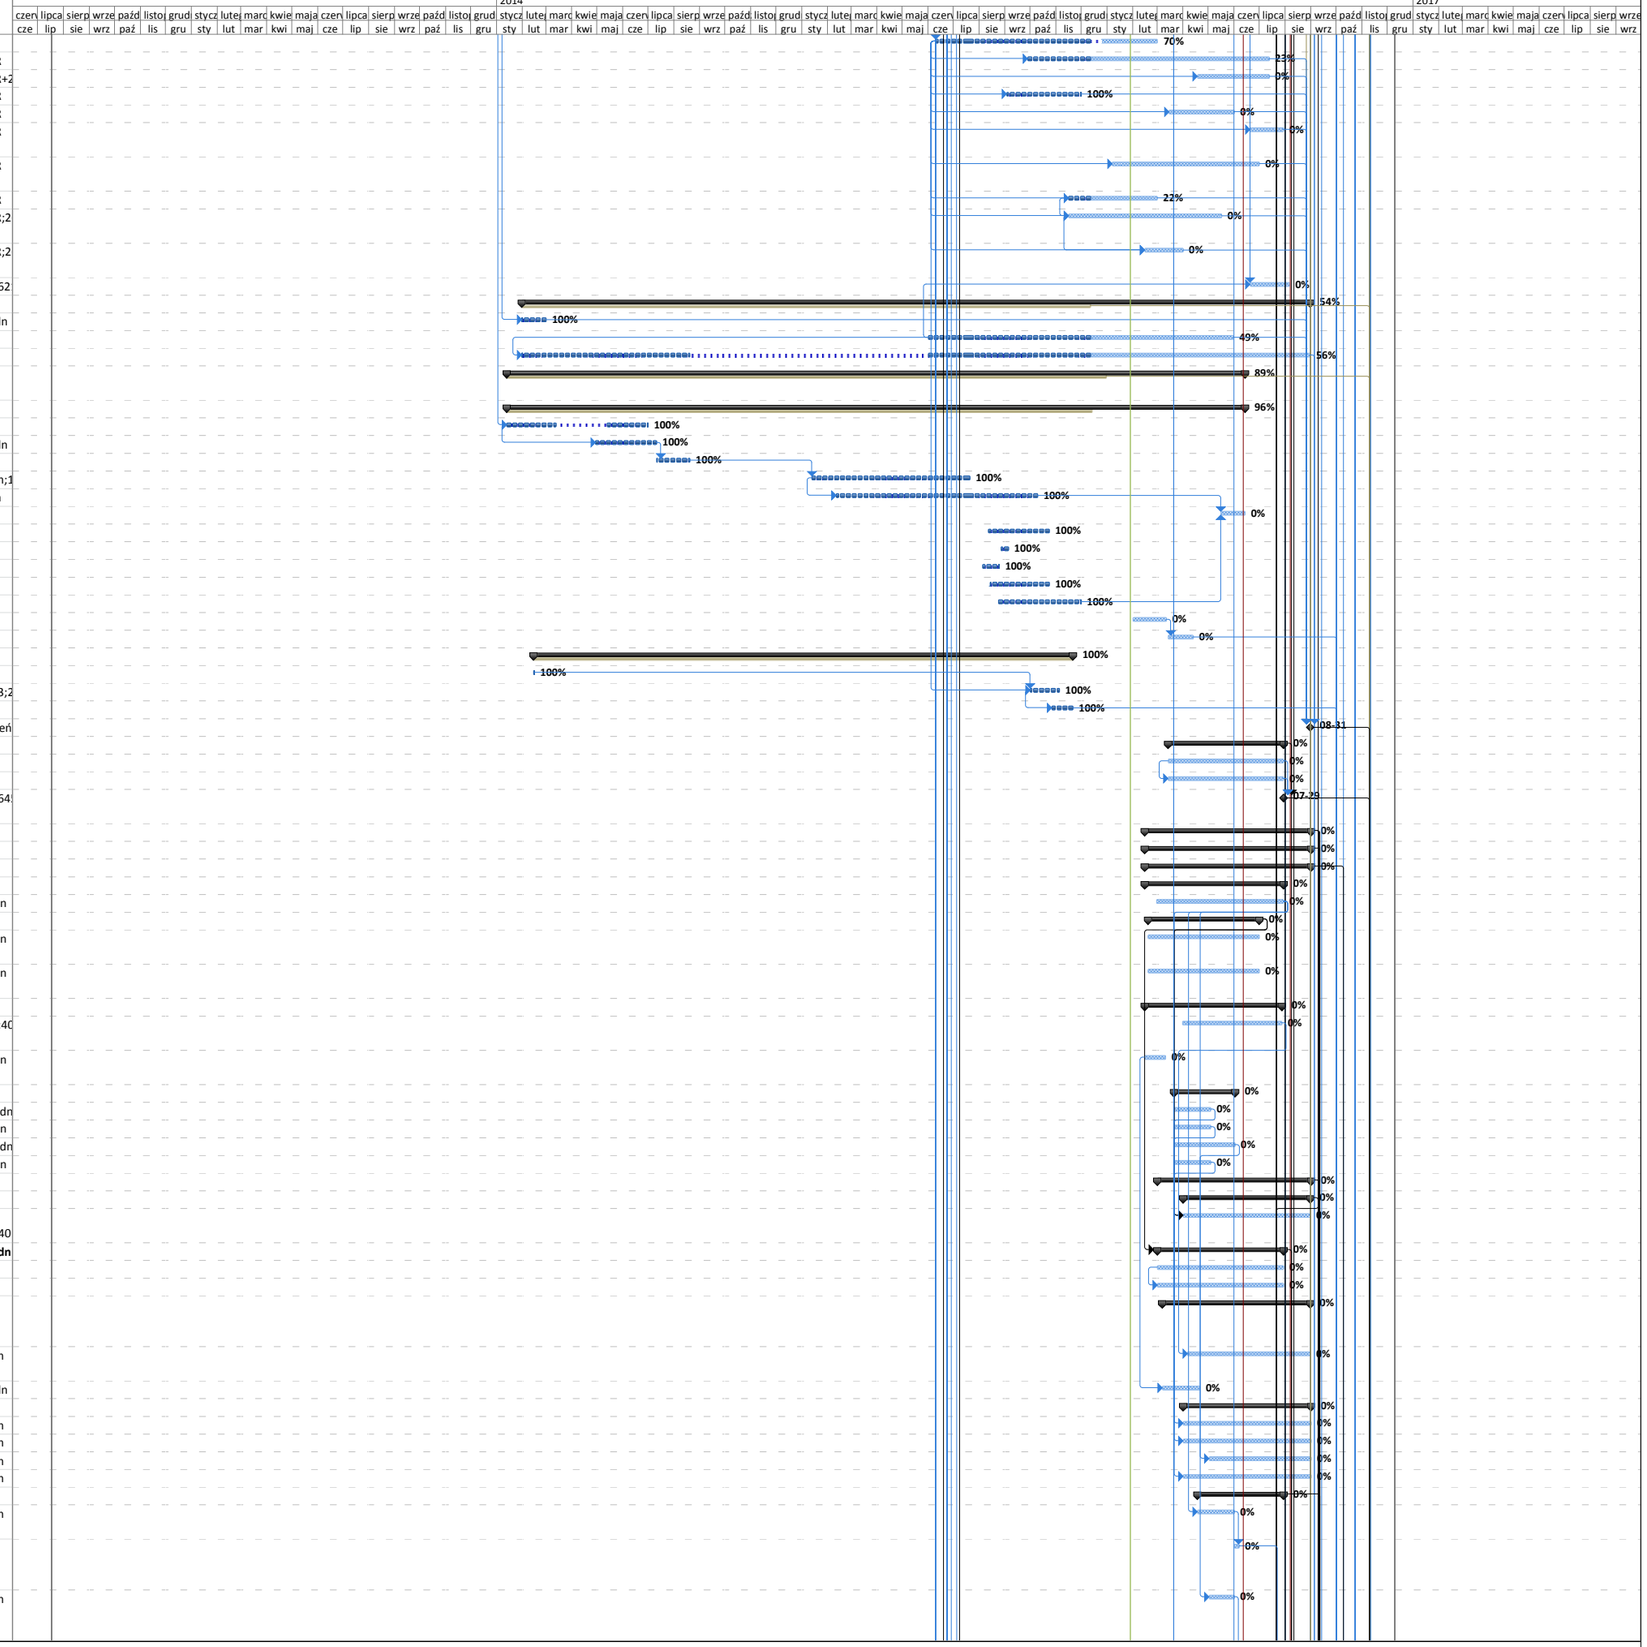
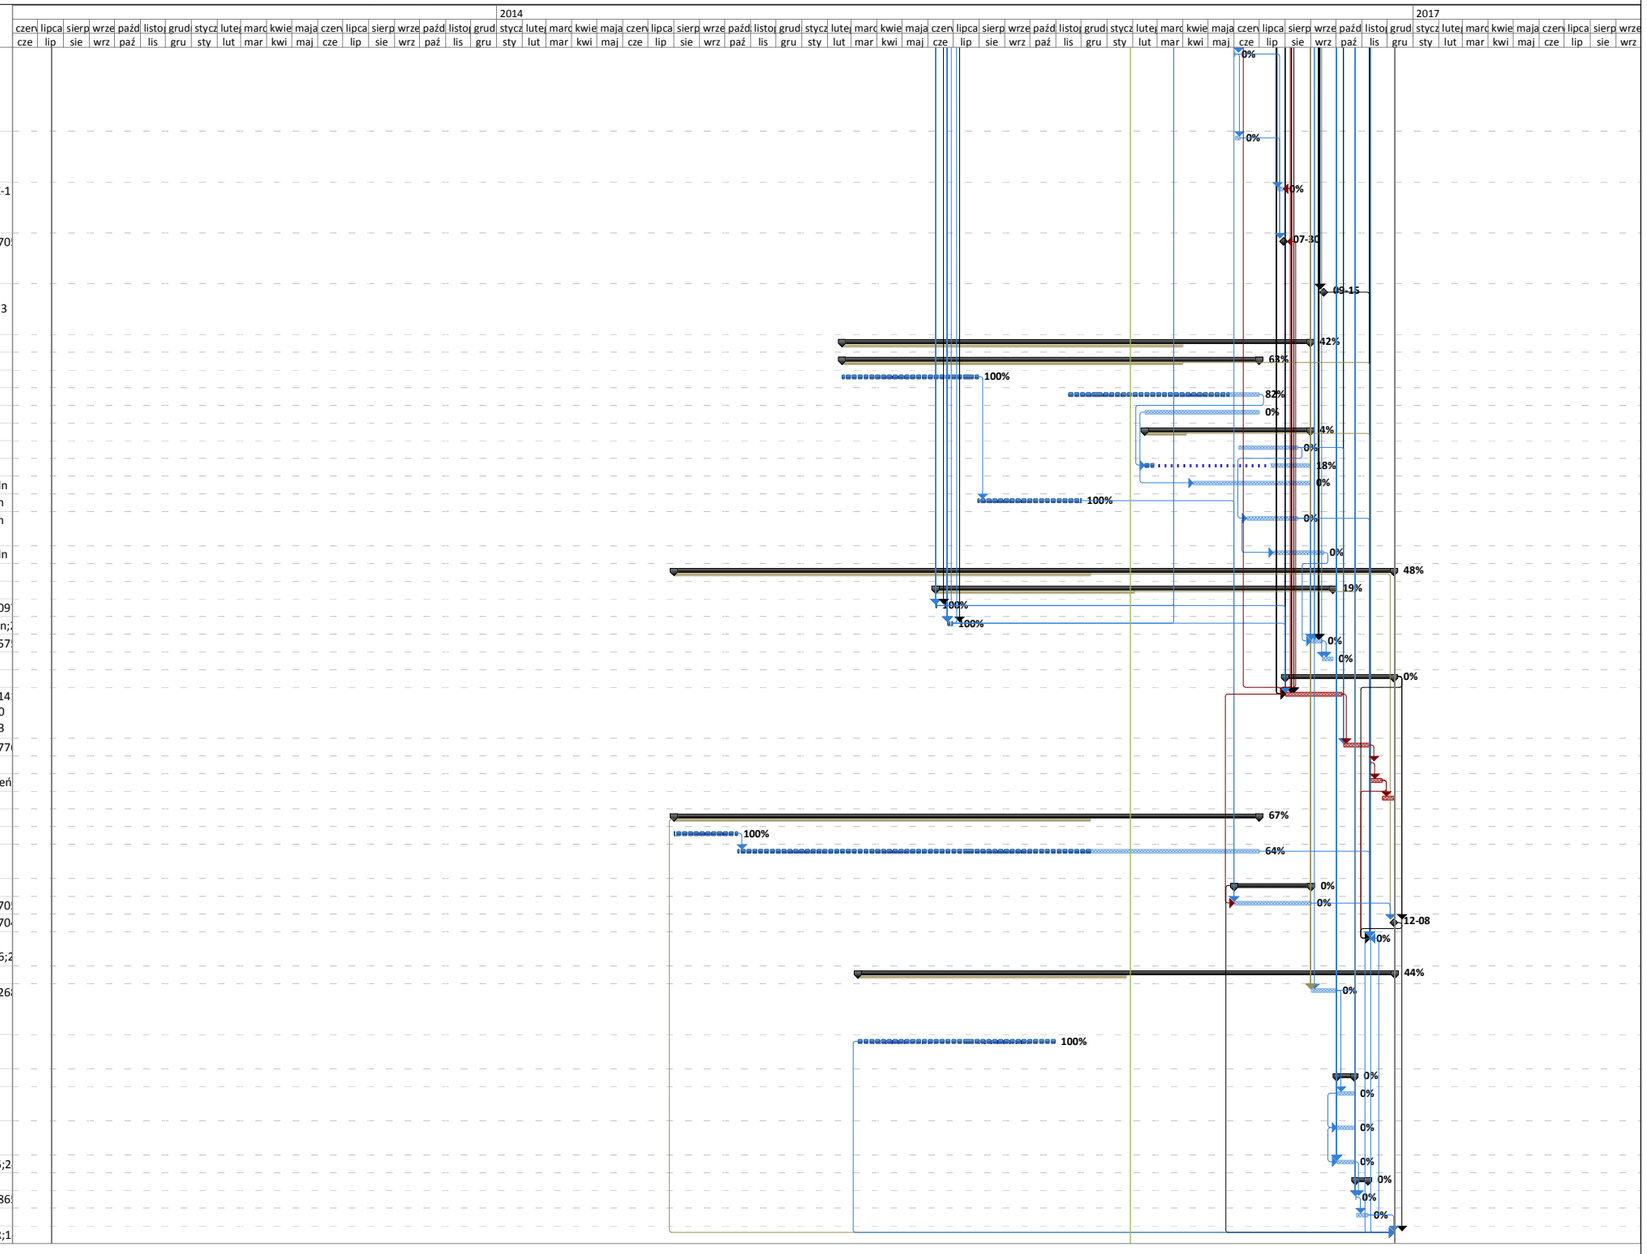
Id.	Pozycja Planu Płatności	Nr projektu	Nazwa zadania	Wykona %	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki
2681			Gotowość Zamawiajacego do wykonania podłączenia zasilania podstawowego SN wraz z wykonaniem linii SN od GPZ Żelechowo do granicy działki ZTUO wraz z wykonaniem przyłącza - Enea Operator	0%	1 dzień	2016-06-01	2016-06-01	2680
2682			Wykonanie podłączenia do przyłącza zasilania podstawowego SN - Enea Operator	0%	5 dn	2016-06-02	2016-06-07	2681
2683			Podanie napięcia zasilania rezerwowego na rozdzielnicę SN wraz z próbami - PKP Energetyka	0%	6 dn	2016-07-23	2016-07-30	2679;2705RZ-1 dzień
2684			Gotowość do podania napięcia zasilania podstawowego SN po próbach - Enea Operator	0%	0 dn	2016-07-30	2016-07-30	2681;2682;270 dzień
2685			Odbiór Prac w branży elektrycznej wraz z kompletem dokumentów koniecznych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie inwestycji	0%	0 dn	2016-09-15	2016-09-15	2648ZR+13 dn;2647ZR+13 dn;2677
2686	**18**		**System wizualizacji, kontroli DCS i AKPiA**	**42%**	**481 dn**	**2015-02-18**	**2016-08-30**	
2687	**18.1**		**Dostawa urządzeń**	**63%**	**429 dn**	**2015-02-18**	**2016-06-30**	
2688	18.1.1		Dostawa systemu	100%	118 dn	2015-02-18	2015-07-30	
2689	18.1.2		Dostawa aparatury	82%	170 dn	2015-11-16	2016-06-30	
2690	18.1.3		Dostawa okablowania, tras	0%	118 dn	2016-02-15	2016-06-30	
2691	**18.2**		**Montaż urządzeń**	**4%**	**170 dn**	**2016-02-15**	**2016-08-30**	
2692	18.2.1		Montaż systemu	0%	61 dn	2016-06-06	2016-08-15	
2693	18.2.2		Montaż aparatury	18%	50 dn	2016-02-15	2016-08-30	2689
2694	18.2.3		Montaż okablowania, tras	0%	120 dn	2016-04-13	2016-08-30	2690RR+15 dn
2695	18.3		Implementacja systemu po testach na warsztacie FAT	100%	88 dn	2015-07-30	2015-11-30	2688ZR-15 dn
2696	18.4		Gotowość do uruchomienia instalacji po testach na budowie SAT	0%	52 dn	2016-06-16	2016-08-15	2692ZR-54 dn
2697	18.5		Uruchamianie i rozruchy w branży AKPiA	0%	52 dn	2016-07-18	2016-09-15	2696RR+22 dn
2698	**19**		**Próby, testy, odbiory, szkolenia**	**48%**	**739 dn**	**2014-08-01**	**2016-12-08**	
2699	**19.1**		**Prace odbiorowe**	**19%**	**408 dn**	**2015-06-10**	**2016-09-26**	
2700	19.1.1		Próba ciśnieniowa kotła - linia 1	100%	1 dzień	2015-06-10	2015-06-10	2140;2108;209
2701	19.1.2		Próba ciśnieniowa kotła - linia 2	100%	4 dn	2015-06-24	2015-06-29	2141ZR+16 dn;
2702	19.1.3		Trawienie i dmuchanie - linia 1	0%	11 dn	2016-09-01	2016-09-13	2139;2574;257
2703	19.1.4		Trawienie i dmuchanie - linia 2	0%	11 dn	2016-09-14	2016-09-26	2139;2702
2704	**19.2**		**Próby Końcowe**	**0%**	**112 dn**	**2016-08-01**	**2016-12-08**	
2705	19.1.5		Próby Indywidualne (próby funkcjonalne technologiczne poszczególnych urządzeń i węzłów techn.)	0%	59 dn	2016-08-01	2016-10-07	1952;2140;214 dn;2293ZR-20 dn;2425ZR-33
2706	19.2.1		Rozruch i regulacja	0%	27 dn	2016-10-10	2016-11-09	2692;2649;177
2707	19.2.2		Przekazanie do ruchu próbnego	0%	1 dzień	2016-11-10	2016-11-10	2706
2708	19.2.3		Ruch próbny - 72 h	0%	13 dn	2016-11-10	2016-11-24	2707ZR-1 dzień
2709			Odbiory	0%	12 dn	2016-11-25	2016-12-08	2708
2710	**19.3**		**Pozwolenie Zintegrowane**	**67%**	**601 dn**	**2014-08-01**	**2016-06-30**	
2711	19.3.1		Wniosek o pozwolenie zintegrowane	100%	54 dn	2014-08-01	2014-10-15	
2712	19.3.2		Procedowanie i uzyskanie pozwolenia zintegrowanego	64%	477 dn	2014-10-16	2016-06-30	2711
2713	**19.4**		**Szkolenia**	**0%**	**79 dn**	**2016-06-01**	**2016-08-31**	
2714	19.4.1		Szkolenia	0%	79 dn	2016-06-01	2016-08-31	1782;2695;270
2715			Zakończenie prób, testów i szkoleń	0%	0 dn	2016-12-08	2016-12-08	2698;2714;270
2716			Złożenie wniosku o wystawienie Świadectwa Przejęcia	0%	1 dzień	2016-11-10	2016-11-10	2708ZR-28 dn;2712;2696;
2717	**20**		**Przekazanie do eksploatacji**	**44%**	**552 dn**	**2015-03-09**	**2016-12-09**	
2718	20.1		Opracowanie wniosków oraz uzyskanie opinii organów wymienionych w art.. 56 ustawy Prawa budowlanego tj. PIS, PSP	0%	27 dn	2016-09-01	2016-10-01	1806;1954;226
2719	20.2		Opracowanie dokumentacji do wniosku o uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej i	100%	203 dn	2015-03-09	2015-10-30	
2720	**20.3**		**Inspekcja obiektu**	**0%**	**18 dn**	**2016-10-01**	**2016-10-22**	
2721	20.3.1		Udział w przeprowadzanej kontroli obiektu przez PINB	0%	21 cdn	2016-10-01	2016-10-22	2718
2722	20.3.2		Konsultacje z organem PINB wyjaśnienie uwag i dostarczenie niezbędnej dokumentacji	0%	21 cdn	2016-10-01	2016-10-22	2721RR
2723	20.3.3		Zebranie i zamknięcie materiału dowodowego	0%	21 cdn	2016-10-01	2016-10-22	2722RR;2375;2
2724	**20.4**		**Wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie Zakła**	**0%**	**13 dn**	**2016-10-24**	**2016-11-07**	
2725	20.4.1		Pozwolenie na użytkowanie zakładu	0%	1 dzień	2016-10-24	2016-10-24	2723;2581;186
2726	20.4.2		Prawomocność decyzji pozwolenia na użytkowani	0%	14 cdn	2016-10-24	2016-11-07	2725
2727			Przekazanie do eksploatacji	0%	1 dzień	2016-12-09	2016-12-09	2726;2716RR;1
